




Relatório do Portifólio de Projetos - PDTIC 2020

VISÃO GERAL DOS PROJETOS


Data: 26/01/2021

Fonte: AGG - <http://agg-planning.app.rede.tst/app/projects>

Situação dos projetos

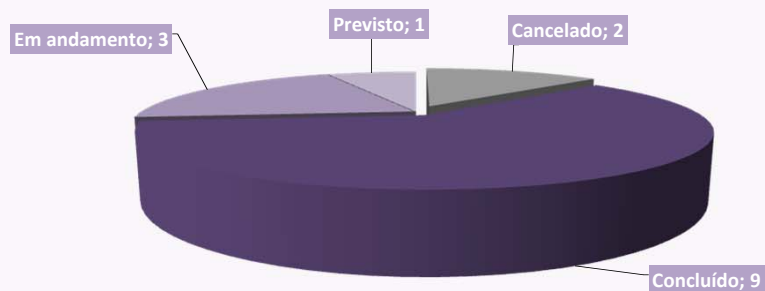

Indicador EGP

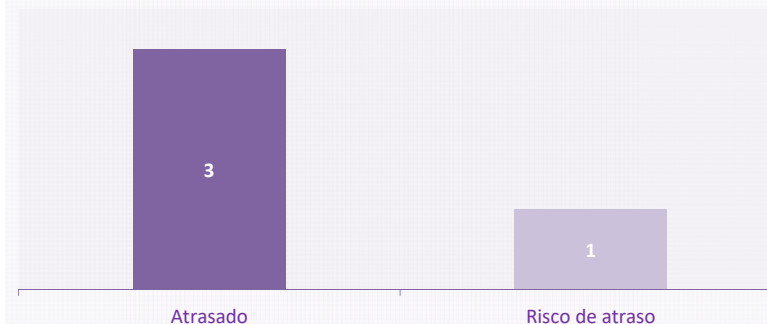

INFORMAÇÕES DOS PROJETOS

Unidade	PDTIC	Nome	Dt. ini. planejada	Dt. fin. planejada	Dt. ini. real	Dt. fin. real	% Projetado	% Executado	Situação (Jira-CDS, Jira-Contr ou EPM)	Situação EGP	Indicador EGP	Categoria projeto
CDS	2020-SW-06	Sistema de Patrimônio	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Priorizado	Cancelado	Cancelado	Software
CDS	2020-SW-05	Sigep 2020	10/02/2020	31/12/2020	(vazio)	18/12/2020	100,00	100,00	Fechado	Concluído	Concluído no prazo	Software
CDS	2020-SW-04	Folha Web – 2020	07/01/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	100,00	73,00	Em execução	Em andamento	Atrasado	Software
CDS	2020-SW-09	Implantação nova ferramenta de BI	01/01/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	100,00	30,00	Pausa	Em andamento	Atrasado	Software
CDS	2020-SW-10	Prêmio CNI de Qualidade 2020	28/10/2019	31/08/2020	(vazio)	31/08/2020	100,00	100,00	Fechado	Concluído	Concluído no prazo	Software
CDS	2020-SW-08	Extrator e-Gestão	20/12/2019	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	100,00	95,00	Aguardando homologação	Em andamento	Atrasado	Software
CDS	2020-SW-01	Secretaria Eletrônica – fase 2020	01/01/2020	31/12/2020	(vazio)	18/12/2020	100,00	100,00	Fechado	Concluído	Concluído no prazo	Software
CDS	2020-SW-02	Gabinete Eletrônico – fase 2020	01/01/2020	31/12/2020	(vazio)	18/12/2020	100,00	100,00	Fechado	Concluído	Concluído no prazo	Software
CDS	2020-SW-11	Bem-te-vi	16/04/2020	31/12/2020	(vazio)	11/12/2020	100,00	100,00	Fechado	Concluído	Concluído no prazo	Software
CDS	2020-SW-13	Estudo para contratação de fábrica de software	09/12/2019	30/04/2020	(vazio)	14/04/2020	100,00	100,00	Fechado	Concluído	Concluído no prazo	Software
CGOV	2020-GG-04	2020-GG-04 – Solução de Gestão de Serviços-Implantação Fase 2	01/07/2020	30/07/2021	(vazio)	(vazio)	53,05	0,00	Não Iniciado	Previsto	Risco de atraso	Preditivo
CGOV	2020-GG-01	2020-GG-01 – Aprimoramento do IGovTIC-JUD	18/02/2020	18/12/2020	18/02/2020	21/12/2020	100,00	100,00	Concluído	Concluído	Concluído com atraso	Preditivo
CGOV	2020-SI-01	2020-SI-01 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – FASE 2	28/09/2020	17/12/2021	(vazio)	(vazio)	26,97	0,00	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Preditivo
CSUP	2019-SU-13	2020-LO-013 Aquisição Impressora Jato Tinta A3	01/02/2020	30/06/2020	(vazio)	27/01/2020	100,00	100,00	Contratação	Concluído	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-04	2019-AO-019a Atualização OpenScape Contact Center - URA	01/02/2020	30/06/2020	(vazio)	24/05/2019	100,00	100,00	Fechado	Concluído	Concluído no prazo	Contratação
