




Relatório do Portifólio de Projetos - PDTIC 2020

VISÃO GERAL DOS PROJETOS

Data: 30/11/2020

Fonte: AGG - <http://agg-planning.app.rede.tst/app/projects>

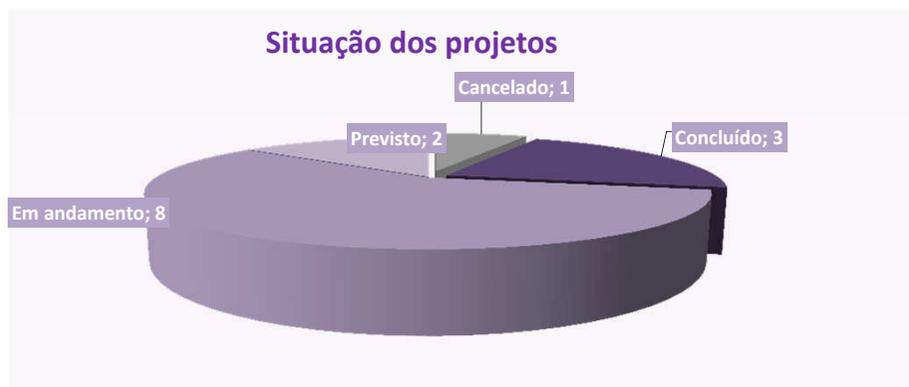

INFORMAÇÕES DOS PROJETOS

Unidade	PDTIC	Nome	Dt. ini. planejada	Dt. fin. planejada	Dt. ini. real	Dt. fin. real	% Projetado	% Executado	Situação (Jira-CDS, Jira-Contr ou EPM)	Situação EGP	Indicador EGP	Categoria projeto
CDS	2020-SW-06	Sistema de Patrimônio	31/07/2020	30/07/2021	(vazio)	(vazio)	33,52	0,00	Priorizado	Cancelado	Cancelado	Software
CDS	2020-SW-05	Sigep 2020	10/02/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	90,46	85,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-04	Folha Web – 2020	07/01/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	91,36	73,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-09	Implantação nova ferramenta de BI	01/01/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	91,51	30,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-10	Prêmio CNI de Qualidade 2020	28/10/2019	31/08/2020	(vazio)	31/08/2020	100,00	100,00	Fechado	Concluído	Concluído no prazo	Software
CDS	2020-SW-08	Extrator e-Gestão	20/12/2019	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	91,78	85,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-01	Secretaria Eletrônica – fase 2020	01/01/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	91,51	85,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-02	Gabinete Eletrônico – fase 2020	01/01/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	91,51	85,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-11	Bem-te-vi	16/04/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	88,03	85,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-13	Estudo para contratação de fábrica de software	09/12/2019	30/04/2020	(vazio)	14/04/2020	100,00	100,00	Fechado	Concluído	Concluído no prazo	Software
CGOV	2020-GG-04	2020-GG-04 – Solução de Gestão de Serviços-Implantação Fase 2	01/07/2020	30/07/2021	(vazio)	(vazio)	38,58	0,00	Não Iniciado	Previsto	Risco de atraso	Preditivo
CGOV	2020-GG-01	2020-GG-01 – Aprimoramento do IGovTIC/JUD	18/02/2020	18/12/2020	18/02/2020	(vazio)	94,08	28,00	Em Andamento	Em andamento	Risco de atraso	Preditivo
CGOV	2020-SI-01	2020-SI-01 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – FASE 2	28/09/2020	17/12/2021	(vazio)	(vazio)	14,16	0,00	Não Iniciado	Previsto	Risco de atraso	Preditivo
CSUP	2019 SU 04	2019 AO 019a Atualização OpenScape Contact Center URA	01/02/2020	30/06/2020	(vazio)	24/05/2019	100,00	100,00	Pesquisa de Preços	Concluído	Concluído no prazo	Contratação
