

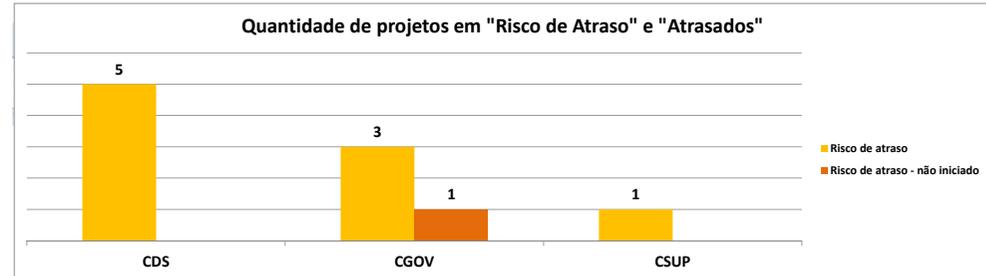
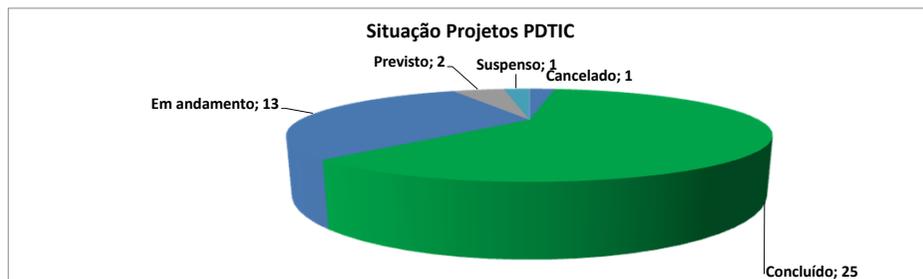


## VISÃO GERAL DOS PROJETOS DO PDTIC

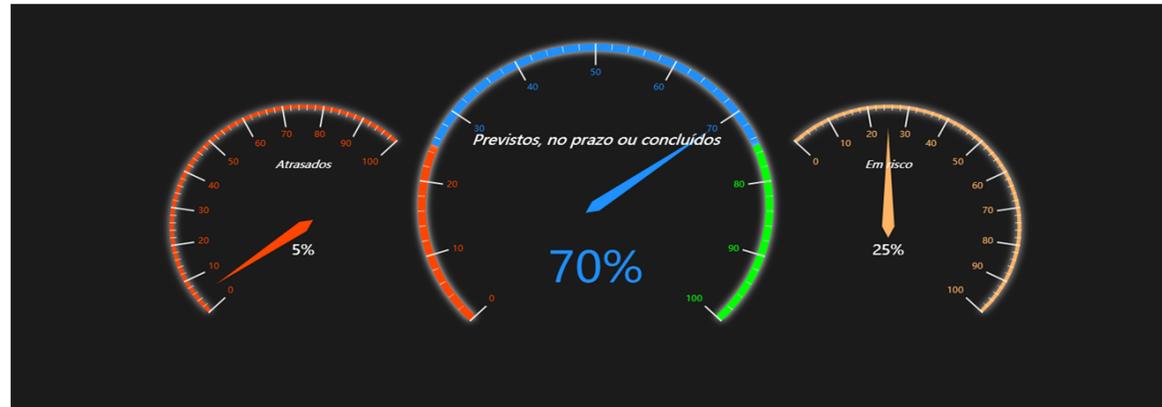

## SITUAÇÃO POR CATEGORIA DO PROJETO

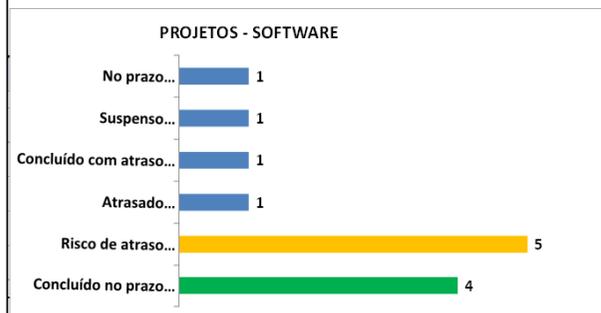

Observação: \* Para efeito de acompanhamento do PDTIC, os projetos de "contratação" são considerados concluídos a partir da etapa "Análise P.A. e Aprovação TR", ou seja, quando o Processo Administrativo sai da SETIN.

## QUADRO RESUMO - PROJETOS

Unidade	PDTIC	Nome	Dt. ini. planejada	Dt. fin. planejada	Dt. ini. real	Dt. fin. real	% Projetado	% Executado	SITUAÇÃO			
									Situação	Situação complementar	Situação EGP	Categoria projeto
CDS	2019-SW-01	Plenário Eletrônico – Fase 3	05/07/2018	31/03/2019	(vazio)	31/03/2019	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Software
CDS	2019-SW-02	Secretaria Eletrônica	02/04/2018	19/12/2019	(vazio)	31/07/2019	92,81	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Software
CDS	2019-SW-03	Assistente de Minutas	01/11/2018	31/12/2019	(vazio)	(vazio)	86,59	70,00	Em execução	No prazo	Risco de atraso	Software
CDS	2019-SW-04	Controle de Petições (e-PET) – Fase 2	01/11/2018	31/10/2019	(vazio)	(vazio)	100,00	90,00	Em execução	No prazo	Atrasado	Software
CDS	2019-SW-05	Bem-te-vi	02/07/2018	19/12/2019	(vazio)	(vazio)	91,59	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Software
CDS	2019-SW-07	Jurisprudência	01/01/2019	19/12/2019	(vazio)	15/04/2019	87,22	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Software
CDS	2019-SW-10	eSocial	24/05/2017	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	67,88	38,00	Em execução	Suspensão	Suspensão	Software
CDS	2019-SW-11	Folha de Pagamento	19/11/2018	31/12/2019	(vazio)	(vazio)	86,00	62,00	Em execução	Risco de atraso	Risco de atraso	Software
CDS	2019-SW-12	PROAD-OUV - Sistema de Ouvidoria	13/05/2019	19/12/2019	(vazio)	(vazio)	79,55	42,00	Em execução	Risco de atraso	Risco de atraso	Software
CDS	2019-AO-015	Contratação de fábrica de software.	01/02/2020	30/05/2020	(vazio)	(vazio)	0,00	60,00	Cadastrado	No prazo	No prazo	Contratação
CDS	2019-SW-18	Sigep - Módulo de Admissão	15/07/2019	31/12/2019	(vazio)	(vazio)	66,27	30,00	Em execução	No prazo	Risco de atraso	Software
CDS	2019-SW-16	Projeto Informações para Gabinetes (INOVAÇÃO)	01/08/2018	31/12/2019	(vazio)	(vazio)	88,97	75,00	Em execução	Risco de atraso	Risco de atraso	Software
CDS	2019-SW-15	e-Gestão - Manual 2.0	01/03/2019	02/09/2019	(vazio)	05/09/2019	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído com atraso	Software
CDS	2019-SW-17	Contratação de nova solução de BI	21/06/2019	31/12/2019	(vazio)	(vazio)	70,47	90,00	Em execução	No prazo	No prazo	Software
CGOV	2019-AD-01	2019-AD-01 – Power Designer Portal - Implantação	26/08/2019	31/10/2019	26/08/2019	(vazio)	100,00	59,00	Cancelado	No prazo	Cancelado	Preditivo
CGOV	2019-GG-01	2019-GG-01 - Aprimoramento do iGovTIC-JUD - v.0.1	12/03/2019	31/07/2019	12/03/2019	29/07/2019	100,00	100,00	Concluído	No prazo	Concluído no prazo	Preditivo
CGOV	2019-GG-02	2019-GG-02 – Reestruturação do EGP-Estudo	08/02/2019	12/06/2019	08/02/2019	25/09/2019	100,00	100,00	Concluído	No prazo	Concluído com atraso	Preditivo
CGOV	2019-GG-03	2019-GG-03 – Reestruturação do EGP-Implantação	30/09/2019	19/12/2019	(vazio)	(vazio)	43,75	0,00	Não iniciado	No prazo	Risco de atraso	Preditivo
CGOV	2019-GG-04	2019-AO-011 - Contratação de serviços de prognósticos e aconselhamento tático e estratégico em Tecnologia da Informação - Assinatura Tipo I	01/02/2019	30/05/2019	(vazio)	22/05/2019	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Contratação
CGOV	2019-GG-05	2019-GG-05 – Solução de Gestão de Serviços-Implantação	17/09/2019	14/05/2020	17/09/2019	(vazio)	20,00	8,00	Não iniciado	No prazo	Risco de atraso	Preditivo
CGOV	2019-SI-01	2019-SI-01 – Modernização do Sistema de Gestão de Segurança da Informação - ESTUDO	01/03/2019	19/12/2019	01/03/2019	(vazio)	84,64	62,00	Em andamento	No prazo	Risco de atraso	Preditivo
CGOV	2019-GG-06	2019-GG-06 Gestão de Portfólio de Projetos de TIC	18/06/2019	28/11/2019	18/06/2019	(vazio)	85,28	64,00	Em andamento	No prazo	Risco de atraso	Preditivo
CITEC	2019-IE-01	2019-IE-01 – MODERNIZAÇÃO DA REDE DE DADOS-IMPLANTAÇÃO	30/04/2019	11/10/2019	30/04/2019	(vazio)	100,00	1,00	Em andamento	No prazo	Atrasado	Preditivo
CITEC	2019-IE-02	2019-AO-023 - Contratação de nova solução de colaboração, incluindo e-mail com chat, vídeo e voz.	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	23/07/2019	100,00	100,00	Análise P.A. e aprovação TR	No prazo	Concluído com atraso	Contratação
CITEC	2019-IE-03	2019-AO-024 - Modernização da rede sem fio do TST	01/02/2019	30/05/2019	(vazio)	03/06/2019	100,00	100,00	Análise Integrante Administrativo	No prazo	Concluído com atraso	Contratação
CSUP	2019-SU-01	2019-AO-029 Contratação de Solução de Videoconferência	01/02/2019	30/05/2019	(vazio)	23/05/2019	100,00	100,00	Análise Conformidade	No prazo	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-02	2019-SU-02 Estudo para contratação de outsourcing de impressão e digitalização no Tribunal	03/09/2018	30/08/2019	01/09/2018	21/03/2019	100,00	100,00	Concluído	No prazo	Concluído no prazo	Preditivo
CSUP	2019-SU-03	2019-AO-020 - Contratação de serviços de customização e suporte de portais	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	30/07/2019	100,00	100,00	Análise Conformidade	No prazo	Concluído com atraso	Contratação
CSUP	2019-SU-05	2019-AO-017 - Aquisição de certificados digitais - TST	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	22/01/2019	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-06	2019-AO-018 - Aquisição de aparelhos telefônicos Gigabit	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	24/05/2019	100,00	100,00	Análise Conformidade	No prazo	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-07	2019-AO-027 Aquisição de Impressoras Jato de Tinta	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	05/06/2019	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-08	2019-AO-004 - Aquisição de ilhas de edição para a CRTV	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	05/07/2019	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído com atraso	Contratação
CSUP	2019-SU-09	2019-AO-010 - Aquisição de notebooks para ministros do TST	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	17/09/2018	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-10	2019-AO-043 - Aquisição de monitores de vídeo para as salas de sessão	01/02/2019	30/04/2019	(vazio)	29/06/2018	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-11	2019-AO-005 - Aquisição de computadores do tipo workstation (SECOM)	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	03/01/2019	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-14	2019-AO-006 Aquisição de 3 microcomputadores - ENAMAT	01/02/2019	31/08/2019	(vazio)	09/08/2019	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-13	2020-AO-xx1 Aquisição Impressora Jato Tinta A3	01/02/2020	30/06/2020	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Análise Integrante Administrativo	No prazo	Previsto	Contratação
CSUP	2019-SU-17	2019-AO-007 - Aquisição de impressora laser colorida para SECOM	01/02/2019	16/11/2019	(vazio)	(vazio)	95,83	60,00	Autorização Presidência	No prazo	Risco de atraso	Contratação
CSUP	2019-SU-16	2019-AO-009 - Aquisição de mídias criptográficas	01/02/2019	14/08/2019	(vazio)	14/08/2019	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-18	2019-AO-038 - Aquisição de computadores para as salas de sessão	01/02/2019	18/10/2019	(vazio)	23/05/2019	100,00	100,00	Análise Conformidade	No prazo	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-12	2019-AQ-039 - Aquisição de impressoras laser monocromáticas	01/02/2019	29/08/2019	(vazio)	29/08/2019	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-15	2019-AO-040 - Aquisição de equipamentos de videoconferência	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	11/06/2019	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Contratação
