


VISÃO GERAL DOS PROJETOS


Data: 04/03/2020

Fonte: AGG - <http://agg-planning.app.rede.tst/app/projects>

Situação dos projetos

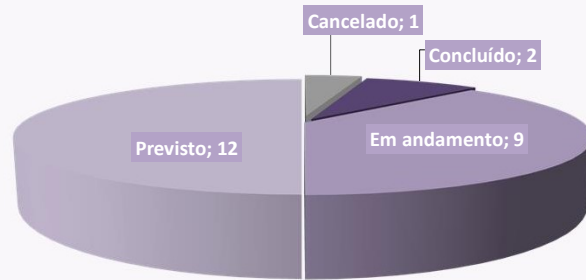

Situação por Categoria

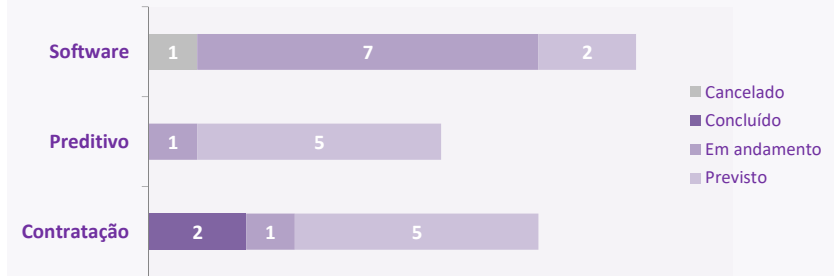

Obs: Para efeito de acompanhamento do PDTIC, os projetos de "contratação" são considerados concluídos a partir da etapa "Análise P.A. e Aprovação TR", ou seja, quando o Processo Administrativo sai da SETIN.

INFORMAÇÕES DOS PROJETOS

Unidade	PDTIC	Nome	Dt. ini. planejada	Dt. fin. planejada	Dt. ini. real	Dt. fin. real	% Projetado	% Executado	Situação (Jira-CDS, Jira-Contr ou EPM)	Situação EGP	Indicador EGP	Categoria projeto
CDS	2020-SW-07	Sistema de Gestão de Eventos	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Priorizado	Previsto	Previsto	Software
CDS	2020-SW-06	Sistema de Patrimônio	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Priorizado	Previsto	Previsto	Software
CDS	2020-SW-05	Sigep 2020	10/02/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	7,08	8,00	Em execução	Em andamento	No prazo	Software
CDS	2020-SW-04	Folha Web – 2020	07/01/2020	18/12/2020	(vazio)	(vazio)	16,47	5,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-09	Implantação nova ferramenta de BI	01/01/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	17,26	10,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-10	Prêmio CNJ de Qualidade 2020	28/10/2019	31/03/2020	(vazio)	(vazio)	82,58	25,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-08	Extrator e-Gestão	20/12/2019	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	19,89	10,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-03	Julgamento com alta disponibilidade	07/01/2020	18/12/2020	(vazio)	(vazio)	16,47	0,00	Fechado	Cancelado	Cancelado	Software
CDS	2020-SW-01	Secretaria Eletrônica – fase 2020	01/01/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	17,26	10,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-02	Gabinete Eletrônico – fase 2020	01/01/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	17,26	10,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CGOV	2020-GG-04	2020-GG-04 – Solução de Gestão de Serviços-Implantação Fase 2	01/07/2020	30/07/2021	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Não Iniciado	Previsto	Previsto	Preditivo
CGOV	2020-AD-01	2020-AD-01 – Dados Abertos	30/03/2020	18/12/2020	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Não Iniciado	Previsto	Previsto	Preditivo
CGOV	2020-GG-01	2020-GG-01 – Aprimoramento do IGovTIC-JUD	18/02/2020	10/07/2020	18/02/2020	(vazio)	10,49	1,00	Em Andamento	Em andamento	Risco de atraso	Preditivo
CGOV	2020-GG-02	2020-GG-02 – GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TIC - IMPLANTAÇÃO	02/03/2020	18/12/2020	(vazio)	(vazio)	0,69	0,00	Não Iniciado	Previsto	Risco de atraso	Preditivo
CGOV	2020-SI-01	2020-SI-01 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – FASE 2	01/07/2020	30/07/2021	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Não Iniciado	Previsto	Previsto	Preditivo
CGOV	2020-GG-03	2020-GG-03 – Elaboração do PETIC 2021-2026	01/06/2020	18/12/2020	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Não Iniciado	Previsto	Previsto	Preditivo
QTEC	2020-IE-04	2020-AO-004 Aquisição de subscrição para software de plataforma como serviço (PaaS)	01/02/2020	(vazio)	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Cadastrado	Previsto	Previsto	Contratação
QTEC	2020-IE-03	2020-AO-005 Aquisição de Certificados Digitais para Sistemas	01/02/2020	(vazio)	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Cadastrado	Previsto	Previsto	Contratação
QTEC	2020-IE-01	2020-AO-006 Aquisição de Suporte para Solução Elastic Search	01/02/2020	(vazio)	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Cadastrado	Previsto	Previsto	Contratação
QTEC	2020-IE-02	2020-AO-007 Aquisição de Solução de Firewall	01/02/2020	(vazio)	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Cadastrado	Previsto	Previsto	Contratação
QTEC	2020-IE-05	2020-AO-008 Contratação de Serviço de Suporte de Licença do Software Jira	01/02/2020	(vazio)	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Cadastrado	Previsto	Previsto	Contratação
CSUP	2019-SU-13	2020-AO-013 Aquisição Impressora Jato Tinta A3	01/02/2020	30/06/2020	(vazio)	27/01/2020	21,33	100,00	Autorização Presidência	Concluído	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-17	2019-AOE-007 - Aquisição de impressora laser colorida para SECOM	01/02/2019	16/11/2019	(vazio)	(vazio)	100,00	60,00	Pesquisa de Preços	Em andamento	Atrasado	Contratação
CSUP	2019-SU-04	2019-AO-019 Atualização OpenScape Contact Center - URA	01/02/2020	30/06/2020	(vazio)	24/05/2019	21,33	100,00	Pesquisa de Preços	Concluído	Concluído no prazo	Contratação
