




VISÃO GERAL DOS PROJETOS DO PDTIC

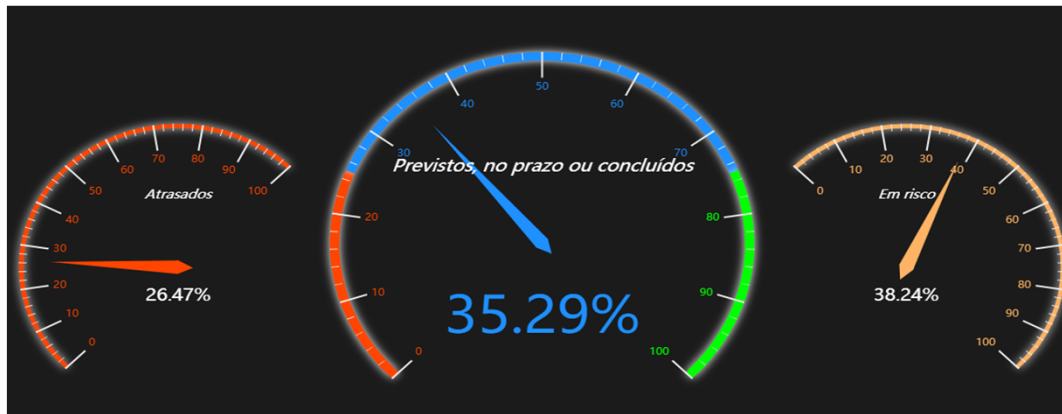

Situação Projetos PDTIC




Quantidade de projetos em "Risco de Atraso" e "Atrasados"




SITUAÇÃO POR CATEGORIA DO PROJETO


PROJETOS - SOFTWARE

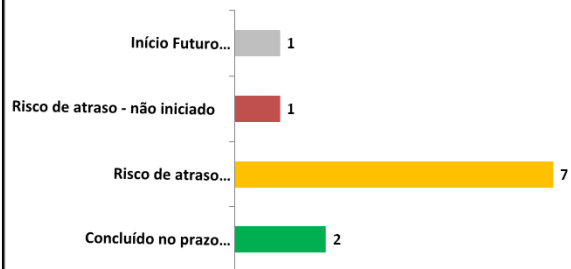

PROJETOS - PREDITIVOS

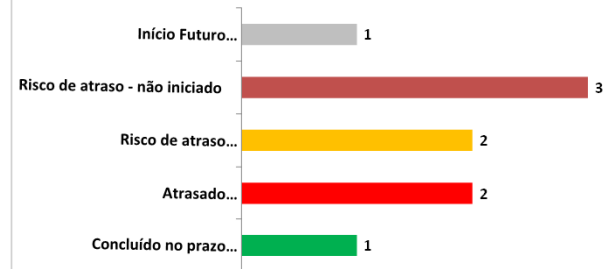

PROJETOS - CONTRATAÇÃO*

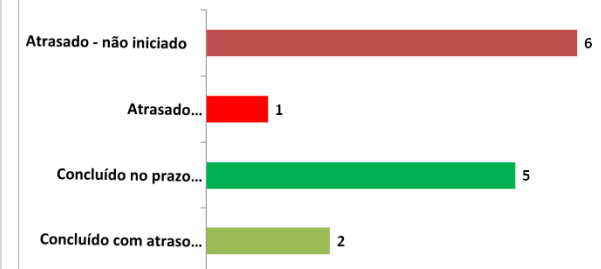

Observação: * Para efeito de acompanhamento do PDTIC, os projetos de "contratação" são considerados concluídos a partir da etapa "Análise P.A. e Aprovação TR", ou seja, quando o Processo Administrativo sai da SETIN.

Relatório do Portfólio de Projetos - PDTIC 2019

QUADRO RESUMO - PROJETOS

Unidade	PDTIC	Nome	Dt. ini. planejada	Dt. fin. planejada	Dt. ini. real	Dt. fin. real	% Projetado	% Executado	Situação	SITUAÇÃO		
										Situação complementar	Situação EGP	Categoria projeto
CDS	2019-SW-01	Plenário Eletrônico – Fase 3	05/07/2018	31/03/2019	(vazio)	31/03/2019	100,00	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Software
CDS	2019-SW-02	Secretaria Eletrônica	02/04/2018	19/12/2019	(vazio)	(vazio)	77,48	50,00	Em execução	Risco de atraso	Risco de atraso	Software
CDS	2019-SW-03	Gabinete Eletrônico – Fase 3 (Voto Assistido)	01/11/2018	19/12/2019	(vazio)	(vazio)	65,86	30,00	Em execução	No prazo	Risco de atraso	Software
CDS	2019-SW-04	Controle de Petições (e PET) Fase 2	01/11/2018	30/09/2019	(vazio)	(vazio)	81,68	80,00	Em execução	No prazo	Risco de atraso	Software
CDS	2019-SW-05	Bem-te-vi	02/07/2018	19/12/2019	(vazio)	(vazio)	73,64	60,00	Pausa	No prazo	Risco de atraso	Software
CDS	2019-SW-07	Jurisprudência	01/01/2019	19/12/2019	(vazio)	15/04/2019	59,94	100,00	Fechado	No prazo	Concluído no prazo	Software
CDS	2019-SW-09	Consulta Pública Unificada	04/11/2019	30/04/2020	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Cadastrado	Previsto	Previsto	Software
CDS	2019-SW-10	eSocial	24/05/2017	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	60,59	38,00	Em execução	Risco de atraso	Risco de atraso	Software
CDS	2019-SW-11	Folha de Pagamento	19/11/2018	31/12/2019	(vazio)	(vazio)	62,41	35,00	Em execução	Risco de atraso	Risco de atraso	Software
CDS	2019-SW-12	Sistema de Ouvidoria	13/05/2019	19/12/2019	(vazio)	(vazio)	35,91	1,00	Em execução	Risco de atraso	Risco de atraso	Software
CDS	2019-SW-13	Serviços de Ciência de Dados	01/07/2019	19/12/2019	(vazio)	(vazio)	17,54	0,00	Cadastrado	Previsto	Risco de atraso	Software
CDS	2019-SW-14	2019-AO-015 – Contratação de fábrica de software.	01/02/2019	30/05/2019	(vazio)	(vazio)	100,00	0,00	Cadastrado		Atrasado	Contratação
CGOV	2019-AD-01	2019-AD-01 – POWER DESIGNER PORTAL-IMPLANTAÇÃO	01/07/2019	30/10/2019	(vazio)	(vazio)	24,79	0,00	Não iniciado	Previsto	Risco de atraso	Preditivo
CGOV	2019-AD-02	2019-AD-02 – Norma curadoria de dados	02/09/2019	19/12/2019	(vazio)	(vazio)	0,00	0,00	Não iniciado	Previsto	Previsto	Preditivo
CGOV	2019-GG-01	2019-GG-01 – Aprimoramento do iGovTIC-JUD - v.0.1	12/03/2019	31/07/2019	12/03/2019	(vazio)	100,00	98,00	Em Andamento	No prazo	Atrasado	Preditivo
CGOV	2019-GG-02	2019-GG-02 – Reestruturação do EGP-Estudo	08/02/2019	12/06/2019	08/02/2019	(vazio)	100,00	76,00	Em Andamento - COM comprometimento no prazo final do projeto		Atrasado	Preditivo
CGOV	2019-GG-03	2019-GG-03 – Reestruturação do EGP-Implantação	22/07/2019	19/12/2019	(vazio)	(vazio)	6,00	0,00	Não iniciado	Previsto	Risco de atraso	Preditivo
CGOV	2019-GG-04	2019-AO-011 - Contratação de serviços de prognósticos e aconselhamento tático e estratégico em Tecnologia da Informação - Assinatura Tipo I	01/02/2019	30/05/2019	(vazio)	22/05/2019	100,00	100,00	Pesquisa de Preços		Concluído no prazo	Contratação
CGOV	2019-GG-05	2019-GG-05 – Solução de Gestão de Serviços-Implantação	02/05/2019	29/05/2020	(vazio)	(vazio)	22,90	0,00	Não iniciado	Previsto	Risco de atraso	Preditivo
CGOV	2019-SI-01	2019-SI-01 – Modernização do Sistema de Gestão de Segurança da Informação - ESTUDO	01/03/2019	19/12/2019	01/03/2019	(vazio)	51,88	39,00	Em Andamento	No prazo	Risco de atraso	Preditivo
CITEC	2019-IE-01	2019-IE-01 – MODERNIZAÇÃO DA REDE DE DADOS-IMPLANTAÇÃO	30/04/2019	11/10/2019	30/04/2019	(vazio)	56,10	1,00	Em Andamento	No prazo	Risco de atraso	Preditivo
CITEC	2019-IE-02	2019-AO-023 - Contratação de nova solução de colaboração, incluindo e-mail com chat, vídeo e voz.	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	(vazio)	100,00	0,00	Análise P.A. e aprovação TR		Atrasado	Contratação
CITEC	2019-IE-03	2019-AO-024 - Modernização da rede sem fio do TST	01/02/2019	30/05/2019	(vazio)	03/06/2019	100,00	100,00	Análise Integrante Administrativo		Concluído com atraso	Contratação
CSUP	2019-SU-01	2019-AO-029 Contratação de Solução de Videoconferência	01/02/2019	30/05/2019	(vazio)	23/05/2019	100,00	100,00	Análise P.A. e aprovação TR		Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-02	2019-SU-02 Estudo para contratação de outsourcing de impressão e digitalização no Tribunal	03/09/2018	30/08/2019	01/09/2018	21/03/2019	91,69	100,00	Concluído	Concluído no prazo	Concluído no prazo	Preditivo
CSUP	2019-SU-03	2019-AO-020 - Contratação de serviços de customização e suporte de portais	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	(vazio)	100,00	30,00	Análise Integrante Administrativo		Atrasado	Contratação
CSUP	2019-SU-04	2019-AO-019 - Contratação de serviços para inclusão de novas funcionalidades e reprogramação da URA	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	(vazio)	100,00	0,00	Administrativo		Atrasado	Contratação
CSUP	2019-SU-05	2019-AO-017 - Aquisição de certificados digitais - TST	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	22/01/2019	100,00	100,00	Licitação / Prorrogação		Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-06	2019-AO-018 - Aquisição de aparelhos telefônicos Gigabit	01/02/2019	30/04/2019	(vazio)	24/05/2019	100,00	100,00	Análise P.A. e aprovação TR		Concluído com atraso	Contratação
CSUP	2019-SU-07	2019-AO-027 Aquisição de Impressoras Jato de Tinta	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	05/06/2019	100,00	100,00	Pesquisa de Preços		Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-08	2019-AOE-004 - Aquisição de ilhas de edição para a CRTV	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	(vazio)	100,00	0,00	Análise Integrante Administrativo		Atrasado	Contratação
CSUP	2019-SU-09	2019-AO-010 - Aquisição de notebooks para ministros do TST	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	17/09/2018	100,00	100,00	Licitação / Prorrogação		Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-10	2019-AOE-003 - Aquisição de monitores de vídeo para as salas de sessão	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	(vazio)	100,00	0,00	Pesquisa de Preços		Atrasado	Contratação
CSUP	2019-SU-11	2019-AOE-005 - Aquisição de computadores do tipo workstation (SECOM)	01/02/2019	30/06/2019	(vazio)	(vazio)	100,00	0,00	Pesquisa de Preços		Atrasado	Contratação
