



1. RESUMO DA SITUAÇÃO DOS PROJETOS E AÇÕES TÉCNICAS

Situação dos Projetos e Ações Técnicas

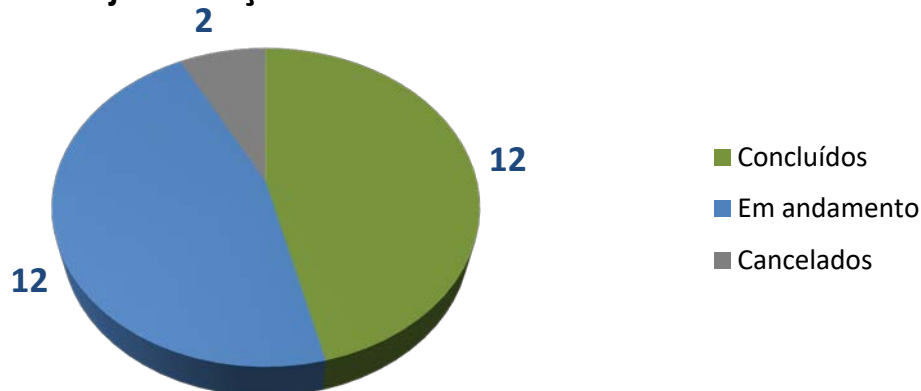

Obs.: Dos 12 projetos em andamento, 10 estão contemplados no PDTIC 2019 e outros dois estão com previsão de término para março.

Projetos e Ações Técnicas Concluídas

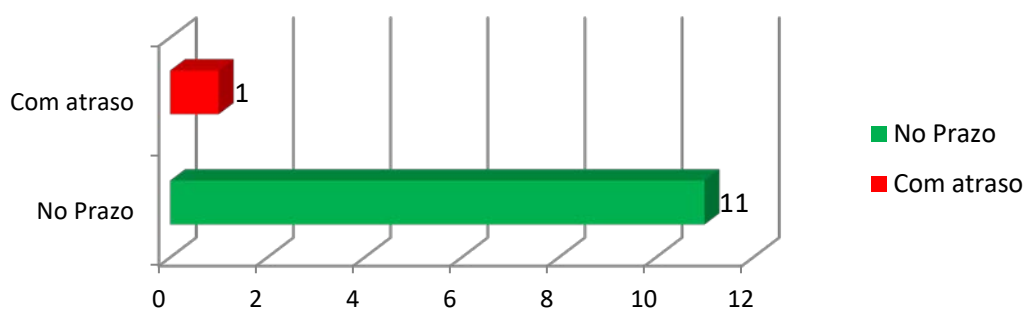

Resumo da Situação por Unidade

Unidade	Concluídos	Em andamento	Cancelados	Total PDTIC
CDS	1	7	1	9
CGOV	5	0	1	6
CITEC	2	4	0	6
CSUP	3	1	0	4
ASTA	1	0	0	1
Total	12	12	2	26

2. RELAÇÃO DOS PROJETOS E AÇÕES TÉCNICAS

RESP.	NOME DO PROJETO	% DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
CSUP	2016-PR-06 Modernização do parque de computadores	100%	Concluído dentro do prazo
CITEC	2017-PR-02 Reestruturação dos discos de rede do TST	100%	Concluído dentro do prazo
CGOV	2017-PR-04 Aprimoramento da Gestão de Serviços de TIC	100%	Concluído com atraso
CGOV	2018-PR-01 Implantação da solução de Gestão de Serviços *	-	Cancelado
CSUP	2018-PR-02 Absorção do suporte aos sistemas nacionais	100%	Concluído dentro do prazo
ASTA	2018-AT-12 Elaboração de proposta de alteração do Ato Conj. TST.CSJT.GP nº 9-2015	100%	Concluído dentro do prazo
CGOV	2018-AT-04 Implementação de melhorias na estrutura do PDTIC	100%	Concluído no prazo
CGOV	2018-AT-05 Elaboração de Norma para a Classificação e Tratamento das informações	100%	Concluído dentro do prazo
CGOV	2018-AT-10 Proposta de Política de Gerenciamento de Projetos de TIC	100%	Concluído dentro do prazo
CGOV	2018-AT-11 Definição do processo de Planejamento Anual de Capacitação da SETIN	100%	Concluído dentro do prazo
CITEC	2018-AT-01 Expansão do parque de servidores (Blades)	100%	Concluído dentro do prazo
CITEC	2018-AT-02 Modernização da rede de dados *	70%	Em andamento no prazo
CITEC	2018-AT-03 Atualização do SGBD Oracle *	71%	Em andamento - no prazo
CITEC	2018-AT-06 Expansão do monitoramento de aplicações	90%	Em andamento - atrasado
CITEC	2018-AT-09 Implantação de plataforma como serviço (PaaS)	90%	Em andamento – atrasado
CSUP	2018-AT-07 Estudo para contratação de outsourcing de impressão e digitalização no Tribunal *	90%	Em andamento - no prazo
CSUP	2018-AT-08 Estudo para contratação de solução unificada de colaboração	100%	Concluído dentro do prazo
CDS	2018-PS-01 Plenário Eletrônico – Fase 3 *	40%	Em Andamento
CDS	2018-PS-02 Secretaria Eletrônica *	40%	Em Andamento
CDS	2018-PS-03 Gabinete Eletrônico – Fase 3 *	5%	Em Andamento
CDS	2018-PS-04 eSocial *	20%	Em Andamento
CDS	2018-PS-06 Bem-te-vi *	40%	Em Andamento
CDS	2018-PS-07 Controle de Petições (e-PET) – Fase 2 *	20%	Em Andamento
CDS	2018-PS-08 Folha de Pagamento *	4%	Em Andamento

RESP.	NOME DO PROJETO	% DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
CDS	2018-IN-01 Projeto Temas *	100%	Concluído
CDS	2018-PS-05 Escritório Digital *	-	Cancelado

* Projeto previsto no PDTIC 2019.

3. RESUMO DAS REVISÕES DO PDTIC 2018

AJUSTES REALIZADOS EM PROJETOS E AÇÕES TÉCNICAS				
	INCLUSÕES	ALTERAÇÕES	EXCLUSÕES	TOTAL
1ª REVISÃO	3	0	0	3
2ª REVISÃO	0	8	0	8
3ª REVISÃO	1	3	0	4
4ª REVISÃO	3	7	2	12
