
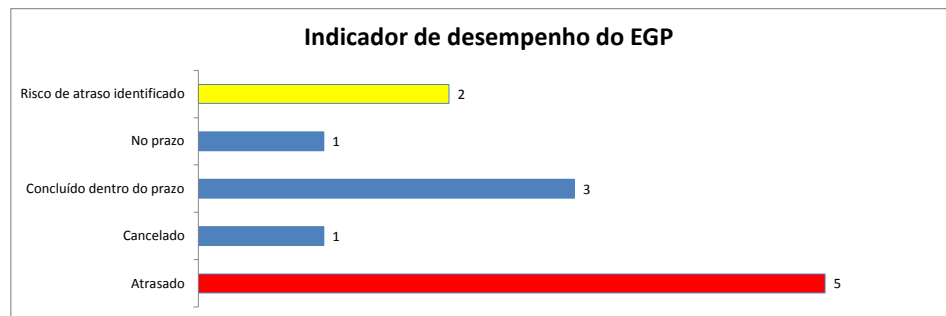


RESUMO EXECUTIVO

* Considera os projetos atualizados entre 30/1/17 a 6/2/17.

Informações retiradas do Portal de Projetos em 6/2/17 às 16h21m2.

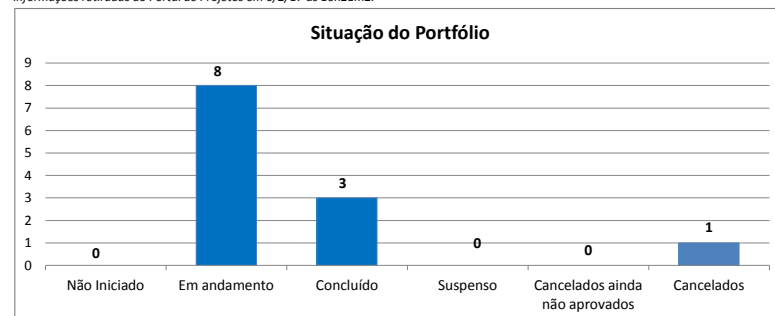

Qtd atualizados no EPM **5**
QTD sem linha de base **0**

Pendências no Planejamento ou Solicitações de Mudanças nos Projetos


Áreas	Projeto	Situação do planejamento ou mudança	Observação
CGI	2016-P-02 Aprimoramento da Gestão de Serviços de TIC (2ª Etapa)	3 - Necessidade de mudança identificada	Foi realizado Learning 3.0 com o objetivo de identificar os principais benefícios a serem alcançados pelo projeto. Será gerado um novo replanejamento do projeto, com data prevista para o dia 28/10/2016.
CDS	2016-P-08 Criação de dashboard de alocação da força de trabalho da SETIN	3 - Necessidade de mudança identificada	O replanejamento previsto ainda não foi realizado.
CITEC	2016-P-05 Modernização da plataforma de correio eletrônico e mensageria	6- Projeto em andamento	
CITEC	2016-P-03 Prospecção e implantação de piloto de solução para Plataforma Orientada a Serviços (PaaS)	6- Projeto em andamento	
CITEC	2016-P-04 Implantação de um processo de gestão de desempenho de soluções de TIC	3 - Necessidade de mudança identificada	Devido ao dinamismo das atividades com as equipes envolvidas, ainda não é possível planejar a mudança necessária. É possível que haja recuperação do prazo ainda.
CITEC	2015-P-03 Atualização da plataforma de GED	6- Projeto em andamento	
CSUP	2014-P-10 Modernização da solução de telecomunicações do TST	6- Projeto em andamento	
CSUP	2016-P-06 Modernização do parque de Microcomputadores	6- Projeto em andamento	

RESUMO POR UNIDADE


Situação dos projetos por unidade

Unidade	Qtd. proj. PDTIC 2016	Qtd concluídos	Qtd não iniciados	Qtd em andamento	Qtd cancelados	Qtd atualizados no EPM	QTD sem linha de base
CDS	2	1	0	1	1	0	0
CGI	2	1	0	1	0	0	0
CITEC	5	1	0	4	0	4	0
CSUP	2	0	0	2	0	1	0
TOTAL	11	3	0	8	1	5	0

Projetos em andamento com "Risco de atraso"

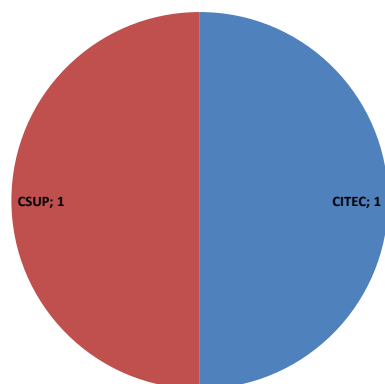

Estado da atualização da Planilha de Gerenciamento de Riscos (PGR) de projetos em andamento

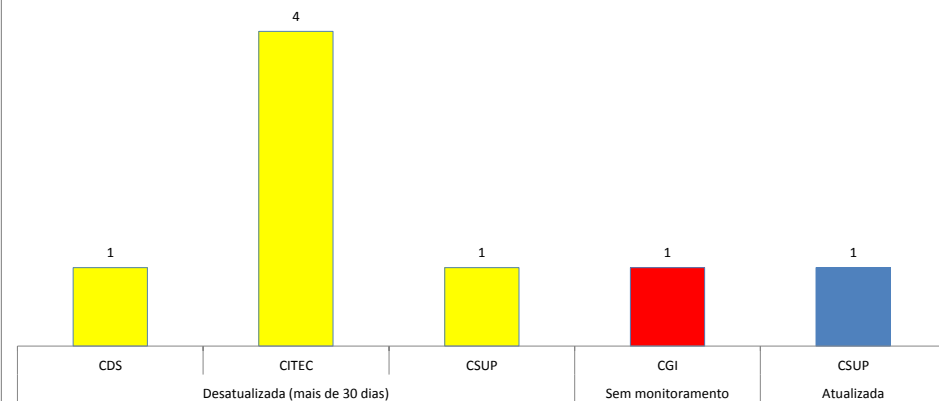

DETALHAMENTO DOS PROJETOS

Unidade Resp.	Nome do projeto	Situação informada pelo GP	% Concluído (calculado pelo EPM)	Início informado no EPM	Término informado no EPM	Comentários	Data comentário	Data de atualização do cronograma no EPM	Situação informada pelo EGP	Projeção do % concluído (calculado pelo EGP)	Início da linha de base	Término da linha de base	Data da Última Atualização da PGR
CDS/SIAD	2013-P-15 Modernização da solução de Business Intelligence do TST	Concluído	100	1/4/2013	1/5/2016	Atividades de migração encerradas. Homologação técnica concluída. Restando apenas formalização do encerramento do projeto.	7/4/2016	26/7/2016	Concluído dentro do prazo	100,00	1/4/2013	1/5/2016	Sem monitoramento
CDS/SIAD	2016-P-08 Criação de dashboard de alocação da força de trabalho da SETIN	Em Andamento - com problemas SEM comprometimento do prazo final do projeto	38	7/12/2015	19/12/2016	Painel de projetos do PDTIC - O painel foi elaborado com os indicadores disponíveis na base do EPM e está disponível na plataforma do BO. Ainda não há informações sobre o esforço alocado nos projetos, o que depende de definições do Escritório de Projetos. Após essas definições, os projetos deverão seguir as orientações de registro do esforço e então será possível apresentar os indicadores no dashboard. Painel de projetos de sistemas (CDS) - Com a finalidade de calcular o percentual de conclusão dos projetos, foram realizados ajustes nos procedimentos da CDS. O painel está em homologação junto à CDS. Painel de projetos da CITEC - O painel encontra-se em prototipação. Algumas conversas já foram realizadas com a unidade para definir os padrões de registro das tarefas dos projetos e os indicadores e gráficos que irão para o dashboard. O replanejamento previsto ainda não foi realizado.	1/7/2016	17/08/2016	Atrasado há 49 dia(s)	100	1/2/2016	19/12/2016	20/5/2016
CDS/SPAD	2016-P-01 Implantação da nova ferramenta de Portal	Cancelado	0	07/12/2015	29/2/2016	A ação orçamentária para viabilizar o projeto foi cancelada, em função dos cortes orçamentários, conforme Memorando COFIN nº 20/2016. O cancelamento do projeto foi efetivado na 1ª Revisão do Plano de Contratações de STIC 2016 e o novo Plano foi aprovado na reunião do CGTI de 23/fevereiro/2016.	1/8/2016	16/3/2016	Cancelado				Sem monitoramento
CGI/SGSI	2015-P-10 Implantação do processo de gestão de riscos de TI na SETIN	Concluído	100	13/02/2015	19/12/2016	Riscos do projeto com status "Fechado". Projeto concluído, aguarda a produção do relatório de encerramento.	21/10/2016	19/12/2016	Concluído dentro do prazo	100	13/2/2015	19/12/2016	7/10/2016
CGI/SNOP	2016-P-02 Aprimoramento da Gestão de Serviços de TIC (2ª Etapa)	Em Andamento	11	7/12/2015	12/12/2016	A equipe conduziu diversas reuniões para coletar os principais pontos de dor e benefícios a serem trabalhados pelo projeto. Foi feita uma sessão de learning 3.0 e diversas entrevistas envolvendo os coordenadores da SETIN e equipe técnica que atua diretamente nos processos relacionados. O replanejamento foi apresentado ao Tiago que pediu que fossem ouvidas as áreas que atuam diretamente com os usuários externos, a fim de coletar as principais reclamações dos usuários da SETIN. Será gerado assim um novo replanejamento do projeto, com data prevista para o dia 28/10	17/10/2016	17/08/2016	Atrasado há 61 dia(s)	100	7/1/2016	7/12/2016	Sem monitoramento
CITEC/SGRE	2016-P-05 Modernização da plataforma de correio eletrônico e mensageria	Em Andamento	24	01/07/2016	08/03/2017	Está em andamento a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares pela equipe da SGRE, o qual deverá envolver a CSUP para possível integração com a solução de videoconferência.	02/02/2017	03/02/2017	Risco de atraso identificado	88	1/7/2016	8/3/2017	1/12/2016

Unidade Resp.	Nome do projeto	Situação informada pelo GP	% Concluído (calculado pelo EPM)	Início informado no EPM	Término informado no EPM	Comentários	Data comentário	Data de atualização do cronograma no EPM	Situação informada pelo EGP	Projeção do % concluído (calculado pelo EGP)	Início da linha de base	Término da linha de base	Data da Última Atualização da PGR
CITEC/SGSB	2015-P-06 Estudo e implantação de nova plataforma de infraestrutura de armazenamento	Concluído	100	26/1/2015	7/3/2016	O equipamento foi configurado e instalado durante o recesso. No mês de janeiro ocorreu a disponibilização das áreas para teste. Em fevereiro ocorrerá a migração de conteúdo e o início da produção. Será fornecido um voucher para a realização dos treinamentos no equipamento para um servidor, com validade de um ano (durante este ano o servidor designado poderá realizar qualquer treinamento disponível). Assim que o voucher for disponibilizado a etapa "Treinamento" será considerada concluída. Assim que o primeiro volume entrar em produção o projeto será considerado concluído. Previsão: fevereiro. André Vitorino	29/1/2016	14/3/2016	Concluído dentro do prazo	100,00	26/1/2015	29/7/2016	Sem monitoramento
CITEC/SGSC	2015-P-03 Atualização da plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos (GED)	Em Andamento	99	01/03/2016	20/01/2017	Foram anexadas o Termo de Recebimento Definitivo relativo às OS's 5 a 10 - referente ao versionamento do GED.	03/02/2017	15/12/2016	Atrasado há 17 dia(s)	100	1/3/2016	20/1/2017	1/12/2016
CITEC/SGSC	2016-P-03 Prospecção e implantação de piloto de solução para Plataforma Orientada a Serviços (PaaS)	Em Andamento	99	28/03/2016	11/11/2016	Toda documentação já foi devidamente concluída, pendente apenas da validação por parte do Coordenador da CITEC.	02/02/2017	02/12/2016	Atrasado há 87 dia(s)	100	28/3/2016	11/11/2016	1/12/2016
CITEC/SGSC	2016-P-04 Implantação de um processo de gestão de desempenho de soluções de TIC	Em Andamento	9	02/05/2016	20/04/2017	Mapeamento a ser realizado em conjunto com a SNOP/CGI, o qual envolve a CITEC e CDS.	02/02/2017	02/12/2016	Atrasado há 53 dia(s)	100	2/5/2016	15/12/2016	1/12/2016
CSUP/SAEQ	2016-P-06 Modernização do parque de computadores	Em Andamento	70	15/12/2015	09/03/2017	O projeto estava em atraso em dez/2016, no EPM, tendo em vista a necessidade de replanejamento para a compra de computadores, porque não houve disponibilidade orçamentária em 2016 e porque o material da licitação será ajustado para atender recomendações da CLCON. Na interpretação do Secretário da SETIN, como essa compra estará submetida aos novos prazos de licitação para 2017 (conclusão do material de licitação até março pela equipe e liberação pela SETIN até junho), fica descaracterizado o atraso real pois o EPM ainda não apresentava o novo planejamento em dez/2016. Desta forma, por orientação do Secretário da SETIN, foi repassado à ASGE, em 27/1/2017, no Paine de Contribuição da SETIN 2016, que o projeto estava em dia em dez/2016.	31/01/2017	28/10/2016	Risco de atraso identificado	93,11111111	15/12/2015	9/3/2017	27/1/2017
CSUP/STELECOM	2014-P-10 Modernização da solução de telecomunicações do TST	Em Andamento	100	24/03/2014	10/01/2017	Anexamos o Relatório de Encerramento do Projeto ao item "Encerramento". Dessa forma, o projeto encontra-se totalmente concluído.	27/01/2017	04/11/2016	No prazo	100	24/3/2014	10/1/2017	10/6/2016
