


RESUMO EXECUTIVO

* Considera os projetos atualizados entre 15/1/18 a 22/1/18.

Informações retiradas do Portal de Projetos em 22/1/18 às 12h57m57.

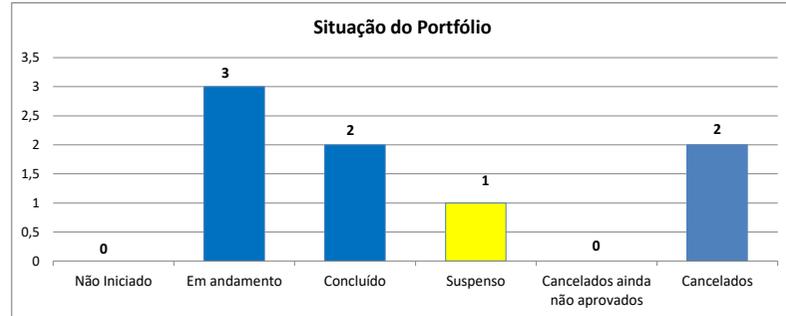

Qtd atualizados no EPM	2
QTD sem linha de base	0

Indicativos de projetos não concluídos


Coordenação	Projeto	Indicativos de desempenho	Indicativos de uso da MGPS
CITEC	2017-PR-02 Reestruturação dos discos de rede do TST	●	●
CSUP	2017-P-03 Aquisição de solução para videoconferência	●	●
	2016-PR-06 Modernização do parque de computadores	●	●
CGOV	2017-PR-04 Aprimoramento da Gestão de Serviços de TIC	●	●

RESUMO POR UNIDADE


Situação dos projetos por unidade

Unidade	Qtd. proj. PDTIC	Qtd concluídos	Qtd não iniciados	Qtd em andamento	Qtd cancelados	Qtd atualizados no EPM	QTD sem linha de base
CDS	0	0	0	0	0	0	0
CGOV	2	1	0	1	1	1	0
CITEC	2	1	0	1	1	1	0
CSUP	2	0	0	1	0	0	0
TOTAL	6	2	0	3	2	2	0

Projetos em andamento com "Risco de atraso"

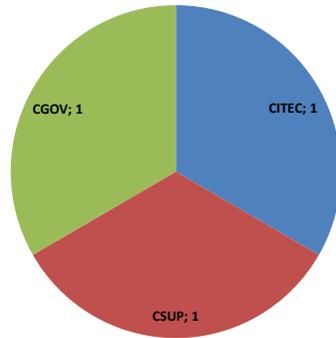

Estado do monitoramento de riscos dos projetos em andamento

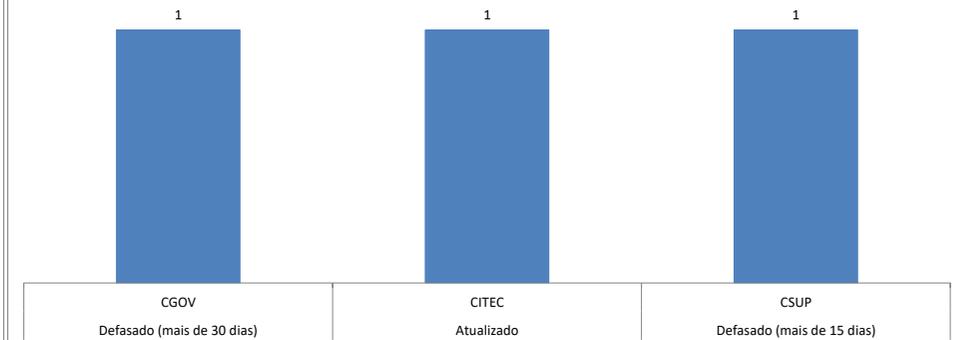

DETALHAMENTO DOS PROJETOS

Unidade Resp.	Nome do projeto	Indicativos de desempenho		% Concluído (calculado pelo EPM)	Projeção do % concluído (calculado pelo EGP)	Comentários	Indicativos de uso da MGPS			Início informado pelo GP	Término informado pelo GP	Início da linha de base	Término da linha de base
		Situação informada pelo GP	Situação projetada pelo EGP				Data comentário	Última publicação do cronograma no EPM	Data do Último Monitoramento de Riscos				
CITEC/SGRE	2016-P-05 Modernização da plataforma de correio eletrônico e mensageria	Cancelado	Cancelado	11	100	A equipe e o demandante do projeto optaram por cancelar o projeto em virtude de o objeto da contratação ter sido modificado consideravelmente. Ademais, foi criado um grupo de trabalho, com Ato Administrativo assinado pela Presidência, que trata das questões da "Aquisição de solução completa de colaboração, gestão de portais intranet e internet e mensageria", item 65, 2017-AO-031. Vale dizer que os estudos técnicos preliminares realizados por este projeto – antes da mudança de escopo – poderão ser aproveitados pelo novo projeto, apesar de não ter havido validação formal (emissão de Termo de Aceite) dessa entrega parcial. Haja vista o cancelamento do projeto, todo o esforço da equipe técnica será remanejado para a contratação da "solução completa de colaboração, gestão de portais intranet e internet e mensageria", conforme Plano de Contratações SETIN – 2017 – versão 3.0 – 2ª revisão, aprovado pelo CGTI em sua 2ª Reunião, realizada em 24/04/2017.	1/8/2017	6/3/2017	1/12/2016	1/7/2016	15/12/2017	1/7/2016	15/12/2017
CITEC/SGSC	2015-P-03 Atualização da plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos (GED)	Concluído	Concluído com atraso de 27 dia(s)	100	100	Aguardando assinatura do Secretário.	14/2/2017	1/3/2017	1/12/2016	1/3/2016	16/2/2017	1/3/2016	20/1/2017
CSUP/SAEQ	2016-PR-06 Modernização do parque de computadores	Em Andamento	Risco de atraso identificado	90	91	Todos os equipamentos foram recebidos. Os microcomputadores modelo 1 (marca Positivo - 1.538 unidades) foram entregues dentro do prazo e os do modelo 2 (marca Daten - 118 unidades) sofreram 14 dias de atraso na entrega. Houve problema no aceite de apenas 1 equipamento do modelo 2, que foi posteriormente trocado e homologado. Verificou-se, ainda, a ocorrência do risco nº 11 (necessidade de nova homologação de componentes devido à entrega de microcomputadores com elementos diferentes daqueles licitados), devido à alteração do SSD pela Daten. Por fim, informa-se que os equipamentos novos foram instalados na SETIN, SETIC e em 5 gabinetes, dentro do previsto no cronograma, apesar do atraso da entrega dos equipamentos da DATEN.	2/1/2018	2/1/2018	2/1/2018	15/12/2015	9/4/2018	15/12/2015	9/4/2018
CITEC/SGPI	2017-PR-02 Reestruturação dos discos de rede do TST	Em Andamento	Risco de atraso identificado	74	89	O projeto não teve andamento durante o recesso (de 20/12 a 8/1/18) pois a equipe técnica do projeto esteve alocada para o recebimento e a instalação dos equipamentos adquiridos no final do ano. A expectativa de que durante o recesso algumas atividades pudessem ser desenvolvidas não se concretizou, permanecendo o projeto com o mesmo estado do mês de dezembro.	16/1/2018	21/11/2017	16/1/2018	1/2/2017	9/3/2018	1/2/2017	9/3/2018
CSUP/SAGCA	2017-P-03 Aquisição de solução para videoconferência	Suspensão	Atrasado há 34 dia(s)	41	100	Em 14/07/2017 foi aprovada a solicitação de mudança, acostada à pasta de execução no EPM, para o projeto de aquisição de solução de videoconferência, a qual propôs sua suspensão, com retorno após a aquisição do objeto, para que seja gerenciada a fase de implantação. A suspensão é motivada pela falta de ascendência sobre as tarefas a serem executadas no projeto, tendo em vista que o Grupo de Trabalho da JT, que trata da solução a ser contratada, é coordenado por um Tribunal Regional. Além disso, a licitação não ocorrerá no TST, de modo que não há controle ou intervenção sobre a abertura do processo licitatório. Assim, prevê-se que a suspensão dure de 4 a 6 meses.	14/7/2017	28/6/2017	28/6/2017	2/1/2017	19/12/2017	2/1/2017	19/12/2017

CGOV/SAEP	2017-P-01 Regulamentação do processo de elaboração e revisão do planejamento estratégico de TIC	Concluído	Concluído dentro do prazo	100	100	Os Guias de Elaboração do PETIC e do PDTIC foram concluídos e aprovados. Foi elaborada Ordem de Serviço para instituição do Processo de Planejamento Estratégico de TIC e encaminhada ao Secretário da SETIN. Foram elaborados, aprovados e assinados o Termo de Aceite e o Relatório de Encerramento do Projeto. Os documentos foram armazenados no EPM. Observação: Este projeto não teve a realizações de Mentorias pois foi executado diretamente pelo Escritório de Projetos da SETIN.	23/6/2017	23/6/2017	23/6/2017	17/2/2017	24/6/2017	17/2/2017	30/6/2017
CGOV/SGPRO	2016-P-02 Aprimoramento da Gestão de Serviços de TIC (2ª Etapa)	Cancelado	Cancelado	11	100	O projeto 2016-P-02 foi cancelado devido a uma grande diferença entre o seu planejamento e o que efetivamente estava sendo executado. O REP (relatório de encerramento) encontra-se disponível no site do projeto. Foi criado um novo projeto, dando continuidade às atividades de Gestão de Serviços. O nome do novo projeto é 2017-P-04	7/8/2017	2/6/2017	Sem monitoramento	7/12/2015	24/1/2018	7/1/2016	7/12/2016
CGOV/SGPRO	2017-PR-04 Aprimoramento da Gestão de Serviços de TIC	Em Andamento	Risco de atraso identificado	54	64	Foi elaborado um novo modelo de documentação do processo, contemplando itens como matriz RACI, papéis e responsabilidades e políticas do processo. O primeiro processo a contemplar esse novo modelo é o processo de Gestão de Mudança.	19/1/2018	20/11/2017	24/11/2017	24/4/2017	27/6/2018	24/4/2017	27/6/2018

Pendências no Planejamento ou Solicitações de Mudanças nos Projetos em Andamento

Coordenação	Projeto	% Concluído (calculado pelo EPM)	Início informado no EPM	Término informado no EPM	Situação do planejamento ou mudança	Observação
CGOV	2017-PR-04 Aprimoramento da Gestão de Serviços de TIC	54	24/04/2017	27/06/2018	Sem necessidade de mudança identificada	Mudança no projeto anuída em 17/11/17, alterando o prazo final do projeto para junho de 2018.
CITEC	2017-PR-02 Reestruturação dos discos de rede do TST	74	01/02/2017	09/03/2018	Necessidade de mudança identificada	Necessidade de replanejamento identificada em 16/1/18, cfe. registro de mentoria de projeto n. 09.
CSUP	2016-PR-06 Modernização do parque de computadores	90	15/12/2015	09/04/2018	Sem necessidade de mudança identificada	Mudança no projeto anuída pelo Secretário em 29/9/17, alterando o prazo final do projeto para abril de 2018.
