



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PDTIC)

2018

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. VISÃO GERAL DO PDTIC	3
3. FONTES DE REFERÊNCIA.....	4
4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	4
4.1 MAPA ESTRATÉGICO DE TIC.....	5
4.2 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE TIC	6
5. EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PDTIC	8
5.1 EXECUÇÃO DO PDTIC.....	8
5.2 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO PDTIC	8
6. RESULTADOS DO PDTIC 2017	10
7. PROJETOS E AÇÕES DO PDTIC 2018	10
7.1 PROJETOS DE SOFTWARE	11
7.2 INOVAÇÕES	14
7.3 PROJETOS.....	15
7.4 AÇÕES TÉCNICAS	17
8. ORÇAMENTO	22
9. CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO DE TIC PARA 2018.....	24
10. CONCLUSÃO	25
11. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES DO PDTIC 2018	27
ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2018.....	28

1. INTRODUÇÃO

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIN, além de ser o canal de modernização de soluções e serviços informatizados do Tribunal Superior do Trabalho, busca promover a excelência dos serviços prestados pela equipe de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), garantindo que esses sejam executados com eficiência e eficácia necessárias ao efetivo atendimento de seus clientes.

De forma a materializar o planejamento das ações que viabilizarão tais objetivos, apresentamos o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do TST para o ano de 2018. Nele, encontram-se registrados os principais projetos da SETIN que alavancam o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) e consubstanciam a contribuição da Secretaria para o alcance das metas institucionais ao longo do período.

O PDTIC 2018 está basicamente estruturado da seguinte forma:

- **Visão geral do Portfólio da SETIN:** *roadmap* que permite ampla visão do direcionamento dos esforços da Secretaria para apoiar as atividades do Tribunal.
- **Resultados do PDTIC anterior:** situação dos projetos de TIC que compuseram o PDTIC 2017.
- **Fontes de referência:** indicação das fontes de referência para a proposição dos projetos e ações e apresentação dos tipos de necessidades de TIC.
- **Projetos:** projetos de TIC planejados para 2018 para fazer face às necessidades identificadas, subdivididos em Projetos de Software, Inovações e outros Projetos.
- **Ações técnicas:** ações, estruturantes ou não, que buscam melhorias nos processos de trabalho que sustentam o funcionamento da TI.
- **Orçamento de TIC:** apresentação do orçamento completo de TIC como anexo (Plano de Contratações 2018). Além disso, demonstração do orçamento de TIC por perfil de investimento, proporcionando uma visão gerencial do portfólio de investimento.
- **Metodologia de execução:** metodologias de trabalho que permitem a execução dos projetos e ações de TIC.

2. VISÃO GERAL DO PDTIC

O quadro a seguir resume, em um *roadmap*, o conjunto de projetos e ações do PDTIC 2018.

Roadmap PDTIC - 2018



3. FONTES DE REFERÊNCIA

As fontes de referência, a partir das quais foram extraídos os projetos e ações que compõem o PDTIC 2018, são apresentadas a seguir:

- **Documentos de Oficialização de Demandas - DOD:** demandas externas ou internas à SETIN recebidas via DOD que contribuem para o alcance da estratégia de TIC.
- **PDTIC 2017:** os resultados alcançados em 2017, bem como aqueles projetos e ações que terão continuidade de sua execução no próximo período, são subsídios para o planejamento de 2018.
- **PETIC 2015-2020:** iniciativas estratégicas do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação para o sexênio 2015-2020 a serem desdobradas em projetos de sustentação do PDTIC 2018.
- **Comitês Gestores:** demandas originadas no Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Superior do Trabalho (CGTI), Comitê Gestor de Sistemas Judiciais do Tribunal Superior do Trabalho (CGSJUD), Comitê Gestor de Sistemas Administrativos do Tribunal Superior do Trabalho (CSADM), Comitê Gestor do Portal do TST (CGPORT) e Comitê Gestor de Segurança da Informação do Tribunal Superior do Trabalho (CGSI).

4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

As premissas de trabalho para a elaboração deste documento são o seu alinhamento com o Planejamento Estratégico de TIC 2015-2020 e o atendimento às necessidades das unidades organizacionais, observadas as diretrizes de TIC da atual administração do TST, de tal forma que os projetos aqui contidos representem sua efetiva implementação, respeitando-se os limites de recursos orçamentários, tecnológicos, contratuais e o adequado dimensionamento da força de trabalho da Secretaria.

A elaboração do PDTIC levou em consideração, também, a observância de dispositivos legais. Nesse sentido, podem igualmente ser considerados norteadores deste trabalho as recomendações dos acórdãos 1603/2008 e 2308/2010, do TCU, e as Resoluções nº 182 e nº 211, respectivamente, de 12 de outubro de 2013 e de 15 de dezembro de 2015,

ambas do CNJ, todos estes fontes de orientação acerca do uso de boas práticas de Governança de TIC.

4.1 MAPA ESTRATÉGICO DE TIC

O mapa estratégico é uma forma gráfica de comunicar a estratégia de TIC, previsto no *Balanced Scorecard – BSC* (indicadores de desempenho balanceados), metodologia adotada na elaboração do Planejamento Estratégico de TIC 2015-2020. Nele são apresentados os diferentes objetivos estratégicos de TIC, relacionados entre si segundo perspectivas estratégicas, de forma a contribuir para o alcance da visão de futuro e suportar a missão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.



O PETIC 2015-2020 é o resultado do esforço de convergência das ações de Tecnologia da Informação e Comunicação às diretrizes e aos objetivos estratégicos fixados pelo TST. Todos os projetos de TIC têm alguma forma de conexão com as demandas de negócio do TST, uma vez que se propõem a criar e sustentar as condições internas

requeridas à oferta de soluções tecnológicas modernas e eficazes, bem como de bons serviços.

4.2 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE TIC

Para cada objetivo estratégico de TIC foram fixadas iniciativas estratégicas que correspondem a ações de grande magnitude e efeito duradouro e visam alcançar ou manter condições essenciais para o êxito do PETIC. A seguir são apresentadas as iniciativas estratégicas do PETIC 2015-2020:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (IE)
1. DESENVOLVER COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES	IE01. Desenvolver plano de capacitação nos aspectos técnico e comportamental. IE02. Fomentar o desenvolvimento de competências.
2. GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	IE03. Garantir a disponibilidade de soluções essenciais às atividades judicantes e administrativas. IE04. Promover prospecção tecnológica de forma a propiciar a inovação contínua. IE05. Promover o dimensionamento adequado dos recursos de TIC.
3. APRIMORAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DE TIC	IE06. Atualizar normas internas de boas práticas de contratações de TIC em consonância com a legislação vigente e com as diretrizes do TST. IE07. Estabelecer o processo de planejamento e execução orçamentária de TIC do TST.
4. APRIMORAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TIC	IE08. Definir e implantar processos de gestão de serviços de TIC. IE09. Definir e implantar ferramentas automatizadas para apoiar a gestão dos serviços de TIC. IE10. Implantar o processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC. IE11. Melhorar o grau de maturidade da Central de Serviços. IE12. Estabelecer Acordos de Nível de Serviço de TIC.
5. APRIMORAR A GESTÃO DE RISCOS DE TIC	IE13. Definir e implantar o processo para Gestão de Riscos de TIC. IE14. Modernizar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação do TST. IE15. Implantar as melhores práticas de desenvolvimento seguro no ciclo de construção de software.
6. APRIMORAR A GESTÃO DE PROJETOS, PROGRAMAS E PORTFÓLIOS	IE16. Implementar ações para elevar a maturidade em gerenciamento de projetos na SETIN. IE17. Aprimorar as soluções automatizadas de gerenciamento de projetos e portfólio. IE18. Estabelecer a gestão de programas e portfólio no âmbito da SETIN. IE19. Aprimorar a metodologia de gestão de projetos para suportar os processos de trabalho da SETIN.
7. ASSEGURAR O FOCO NO JURISDICIONADO E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC	IE20. Implementar medidas em resposta à Pesquisa Anual de Satisfação, em especial buscando a homogeneização da satisfação dos usuários nos diferentes aspectos de soluções de TIC. IE21. Aperfeiçoar os mecanismos e instrumentos de comunicação com os demandantes de soluções de TIC. IE22. Prospectar e prover soluções de TIC que contribuam para a melhoria dos processos de trabalho do TST

Cada projeto ou ação apresentado neste documento está vinculado a uma ou a mais de uma iniciativa estratégica definida no PETIC 2015-2020. Isso significa dizer que os resultados advindos da implementação dos projetos e ações deste PDTIC contribuirão, diretamente, para o alcance da visão de futuro prevista naquele instrumento e, indiretamente, para o atingimento dos objetivos estratégicos institucionais do TST com os quais os objetivos estratégicos de TIC estão relacionados.

5. EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PDTIC

5.1 EXECUÇÃO DO PDTIC

Para a execução dos projetos do PDTIC, deve ser utilizada metodologia formalmente aprovada. Atualmente, a SETIN adota as seguintes metodologias de execução:

- Projetos de Software: Método de Desenvolvimento Ágil
- Outros projetos: MGPS – Metodologia de Gerenciamento de Projetos da SETIN
- Inovações: MGPS ou Método de Desenvolvimento Ágil

Para a execução de ações técnicas, dadas suas características peculiares, a execução pode ser realizada da maneira mais conveniente à equipe de trabalho, não havendo vínculo ou exigência de metodologia específica.

As contratações, Anexo I, são executadas de acordo com Resolução CNJ 182, de 17/10/2013.

5.2 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO PDTIC

É importante o monitoramento permanente do portfólio do PDTIC, de forma que se possam adotar as ações necessárias, em cada momento, buscando qualquer correção de rumo nos projetos e permitindo que eles continuem sustentando o negócio e as operações do Tribunal.

Nesse sentido, o plano de acompanhamento dos projetos do PDTIC está assim composto:

1. Para os projetos que utilizam a MGPS – Metodologia de Gerenciamento de Projetos da SETIN:

- a. Mentoria: os projetos mais críticos do PDTIC passam por um monitoramento realizado pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos da SETIN (EGP), com reuniões periódicas junto às equipes desses projetos, quando são discutidas as dificuldades e alternativas de encaminhamento das soluções, provendo-se também o suporte às ferramentas e ao uso da metodologia de gerenciamento de projetos da SETIN.
 - b. Relatórios periódicos: semanalmente, o EGP gera e distribui ao Comitê de Gestão de TIC da SETIN um relatório dos projetos do PDTIC, de cunho técnico e gerencial, a partir de informações armazenadas no Portal de Projetos, divulgando a situação e as tendências no andamento daqueles projetos.
2. Para os demais projetos e ações técnicas, o acompanhamento é realizado por meio do *roadmap* apresentado no item 2 VISÃO GERAL DO , atualizado pelo menos mensalmente.

Além disso, durante as Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAEs), realizadas de acordo com um calendário específico (vide item 9 - CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO DE TIC PARA 2018) para avaliar os resultados dos indicadores anuais do PETIC 2015/2020, também é discutido o desempenho dos projetos do PDTIC.

O relatório com a situação das contratações de TIC é distribuído semanalmente para que os gestores da SETIN possam acompanhar a execução das contratações. Esse acompanhamento também é realizado durante as RAEs.

6. Resultados do PDTIC 2017

O quadro a seguir apresenta a situação dos projetos que fizeram parte do PDTIC 2017.

PROJETO	UNIDADE	SITUAÇÃO
2015-P-03 Atualização da plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos (GED)	CITEC	Concluído.
2016-P-02 Aprimoramento da Gestão de Serviços de TIC	CGOV	Cancelado. Absorvido pelo projeto 2017-P-04.
2016-P-05 Modernização da plataforma de correio eletrônico e mensageria	CITEC	Cancelado.
2016-P-06 Modernização do parque de computadores	CSUP	Em andamento. Transferido para o PDTIC 2018.
2017-P-01 Regulamentação do processo de elaboração e revisão do planejamento estratégico de TIC	CGOV	Concluído.
2017-P-02 Reestruturação dos discos de rede do TST	CITEC	Em andamento. Transferido para o PDTIC 2018.
2017-P-03 Aquisição de solução para videoconferência	CSUP	Suspensão.
2017-P-04 Aprimoramento da Gestão de Serviços de TIC	CGOV	Em andamento. Transferido para o PDTIC 2018.

7. Projetos e Ações do PDTIC 2018

São apresentados a seguir os quadros individuais com as informações referentes aos projetos e ações técnicas de TIC planejados pelo TST para 2018, indicando início/fim previstos, objetivo, benefícios esperados, unidades responsáveis, objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas associadas e os vínculos orçamentários.

Para os projetos que necessitam de novas contratações (Tipo de Contrato: Novo) foram estabelecidos os vínculos orçamentários, com base no Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação 2018, anexo a este documento.

7.1 PROJETOS DE SOFTWARE

2018-PS-01	Plenário Eletrônico – Fase 3		INÍCIO	FIM
			Jan/18	Dez/18
OBJETIVO	Disponibilizar um ambiente único para julgamento processual no âmbito do TST.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Votação e julgamento não presencial de processos pelos Ministros. • Julgamento de processos do e-SIJ e do PJe em ambiente único. • Incorporação e evolução das funcionalidades do Sistema Sala de Sessão, que será desativado. • Redução do tempo de tramitação dos processos. 		CDS	SSJUD
			OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI	
7	Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC	IE22	Prospectar e prover soluções de TIC que contribuam para a melhoria dos processos de trabalho do TST.	-

2018-PS-02	Secretaria Eletrônica		INÍCIO	FIM
			Abr/18	Dez/18
OBJETIVO	Integrar e utilizar os serviços do PJe nas Secretarias do TST.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento dos processos julgados. • Preparação para publicação. • Publicação de processos julgados. 		CDS	SSJUD
			OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI	
7	Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC	IE22	Prospectar e prover soluções de TIC que contribuam para a melhoria dos processos de trabalho do TST.	-

PROJETOS DE SOFTWARE (CONTINUAÇÃO)

2018-PS-03	Gabinete Eletrônico – Fase 3		INÍCIO	FIM
			Jan/18	Dez/18
OBJETIVO	Integrar e utilizar os serviços do PJe nos Gabinetes do TST.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> Solução única para gestão de processos do e-SIJ e do PJe nos Gabinetes. Disponibilização de sistema satélite do PJe para uso pela JT (TST e Regionais). Aumento da capacidade produtiva dos gabinetes. 		CDS	SSJUD
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI		VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO
7	Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC	IE22	Prospectar e prover soluções de TIC que contribuam para a melhoria dos processos de trabalho do TST.	-

2018-PS-04	eSocial		INÍCIO	FIM
			Jun/17	Dez/18
OBJETIVO	Disponibilizar solução para envio de informações relativas ao eSocial e adequação dos sistemas legados do TST a essa solução.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> Atendimento à norma legal que instituiu o eSocial. Solução única a ser utilizada pela JT (TST e Regionais). Eliminação de outras obrigações legais, tais como RAIS e DIRF, com a consequente desativação das aplicações associadas. 		CDS	SSADM
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI		VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO
7	Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC	IE22	Prospectar e prover soluções de TIC que contribuam para a melhoria dos processos de trabalho do TST.	-

PROJETOS DE SOFTWARE (CONTINUAÇÃO)

2018-PS-05	Escritório Digital (ED)	INÍCIO	FIM
		Jul/18	Dez/18
OBJETIVO	Disponibilizar ambiente único para peticionar no âmbito do TST.	RESPONSÁVEL	
		UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	• Peticionamento em um único local para processos do eSij e Pje.	CDS	SSJUD
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI	
7	Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC	IE22	Prospectar e prover soluções de TIC que contribuam para a melhoria dos processos de trabalho do TST.
		VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO	
		-	

7.2 INOVAÇÕES

2018-IN-01	Projeto Temas	INÍCIO	FIM
		Set/17	Jun/18
OBJETIVO	Definir processos para a gestão dos temas.	RESPONSÁVEL	
		UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Maior celeridade e isonomia dos julgamentos. • Aprimoramento da gestão dos acervos de processos judiciais. • Melhorias nos fluxos de trabalho dos Gabinetes: triagem, votos, etc. 	CDS	SADI
		VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI	
7	Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC	IE22	Prospectar e prover soluções de TIC que contribuam para a melhoria dos processos de trabalho do TST.
		-	

7.3 PROJETOS

2016-PR-06	Modernização do parque de computadores		INÍCIO	FIM
			Dez/15	Abr/18
OBJETIVO	Substituir 300 estações de trabalho da marca ITAUTEC e 1.356 estações de trabalho da marca LENOVO.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Ganho em processamento, agilizando cada vez mais os procedimentos que facilitam o processo judiciário. • Substituição dos equipamentos mais antigos, que perderam a garantia. 		CSUP	SAEQ
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI		VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO
3	Garantir a infraestrutura de TIC	IE03	Garantir a disponibilidade de soluções essenciais às atividades judicantes e administrativas.	2017-AO-024a 2017-AO-024b
7	Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC	IE20	Implementar medidas em resposta à Pesquisa Anual de Satisfação, em especial buscando a homogeneização da satisfação dos usuários nos diferentes aspectos de soluções de TIC.	

2017-PR-02	Reestruturação dos discos de rede do TST		INÍCIO	FIM
			Fev/17	Mar/18
OBJETIVO	Reavaliar os processos de trabalho envolvendo o serviço de disponibilização de arquivos, criando/atualizando suas políticas de uso, de forma a torná-los mais céleres e eficientes aos usuários. Propor um cronograma para migração dos discos de rede para o novo equipamento adquirido.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • O redesenho dos processos de trabalho proposto será no sentido de ganho de produtividade, redução de esforço, de uso de recursos, da melhoria de controle e redução de riscos. 		CITEC	SGSB
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI		VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO
3	Garantir a infraestrutura de TIC	IE03	Garantir a disponibilidade de soluções essenciais às atividades judicantes e administrativas.	-
		IE04	Promover prospecção tecnológica de forma a propiciar a inovação contínua.	
		IE05	Promover o dimensionamento adequado dos recursos de TIC.	

PROJETOS (CONTINUAÇÃO)

2017-PR-04	Aprimoramento da Gestão de Serviços de TIC		INÍCIO	FIM
			Abr/17	Abr/18
OBJETIVO	Revisar, executar, documentar e entregar os seguintes processos de Gerenciamento de Serviços, baseados no modelo ITIL e adaptados ao contexto do TST – Gerenciamento de: “Implantação e Liberação”, “Mudanças”, “Catálogo de Serviços”, “Configuração e de Ativos de Serviço”, “Nível de Serviços”, “Eventos”, “Incidentes”, “Cumprimento de Requisições”, “Continuidade de Serviços” e “Problemas”.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento da satisfação dos usuários dos serviços de TI. • Redução dos riscos nos processos de negócio, em caso de cenários de desastre que impactem a operação dos serviços críticos de TI. 		CGOV	SGPRO
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI		VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO
4	Aprimorar a gestão dos serviços de TIC	IE08	Definir e implantar processos de gestão de serviços de TIC.	-

2018-PR-01	Implantação da solução de Gestão de Serviços		INÍCIO	FIM
			Ago/18	Ago/19
OBJETIVO	Implantação de solução de Gerenciamento de Serviços de TI (do inglês Information Technology Service Management – ITSM), que será utilizada na gestão de serviços de TI.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento da eficiência no atendimento de demandas. • Maior integração dos processos de trabalho da SETIN. • Melhoria da comunicação da TI com o usuário final. • Aumento de funcionalidades de autoatendimento pelos usuários finais. • Redução do uso de recursos, por meio de uma solução integrada, do número de ferramentas necessárias para suportar as disciplinas dos processos de gestão de serviço. 		CGOV	SGPRO
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI		VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO
4	Aprimorar a gestão dos serviços de TIC	IE09 IE11	Definir e implantar ferramentas automatizadas para apoiar a gestão dos serviços de TIC. Melhorar o grau de maturidade da Central de Serviços.	2018-AO-002

7.4 AÇÕES TÉCNICAS

2018-AT-01	Expansão do parque de servidores (<i>Blades</i>)		INÍCIO	FIM
			Jan/18	Dez/18
OBJETIVO	Ampliar a capacidade computacional do datacenter.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Oferta de maior desempenho às aplicações. • Possibilidade de criação de mais ambientes. • Ampliação do número de máquinas virtuais. 		CITEC	SGSB
			VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO	
3	Garantir a infraestrutura de TIC	IE05	Promover o dimensionamento adequado dos recursos de TIC.	2018-AO-008

2018-AT-02	Modernização da rede de dados		INÍCIO	FIM
			Nov/17	Abr/19
OBJETIVO	Renovar a infraestrutura de rede para adequar a demanda e aprimorar os serviços ofertados.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliação da velocidade da rede de 100Mb/s para 1000Mb/s. • Melhoria da estrutura lógica da rede de tal forma que a falha em um ponto não acarrete na indisponibilidade de toda rede. • Substituição dos equipamentos de rede que já estão em uso a mais de 11 anos, não possuindo mais suporte do fabricante. 		CITEC	SGRE
			VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO	
3	Garantir a infraestrutura de TIC	IE03	Garantir a disponibilidade de soluções essenciais às atividades judicantes e administrativas.	2018-AO-012
		IE05	Promover o dimensionamento adequado dos recursos de TIC.	

AÇÕES TÉCNICAS (CONTINUAÇÃO)

2018-AT-03	Atualização do SGBD Oracle	INÍCIO	FIM
		Out/16	Out/18
OBJETIVO	Atualizar para a versão mais recente recomenda pelo fabricante.	RESPONSÁVEL	
		UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Expansão do ciclo de vida do suporte e atualização. • Correção de defeitos conhecidos das versões anteriores. • Disponibilização de novas funcionalidades. • Melhoria no desempenho do banco. 	CITEC	SGBD
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI	
3	Garantir a infraestrutura de TIC	IE03 Garantir a disponibilidade de soluções essenciais às atividades judicantes e administrativas. IE04 Promover prospecção tecnológica de forma a propiciar a inovação contínua. IE05 Promover o dimensionamento adequado dos recursos de TIC.	-

2018-AT-04	Implementação de melhorias na estrutura do PDTIC	INÍCIO	FIM
		Fev/18	Dez/18
OBJETIVO	Evoluir a estrutura do PDTIC buscando torná-lo o mais representativo possível do trabalho realizado pela SETIN.	RESPONSÁVEL	
		UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Demonstração do uso da força de trabalho da SETIN. • Alinhamento do PDTIC às boas práticas utilizadas por outras instituições. 	CGOV	SAEP
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI	
7	Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC	IE21 Aperfeiçoar os mecanismos e instrumentos de comunicação com os demandantes de soluções de TIC.	-

AÇÕES TÉCNICAS (CONTINUAÇÃO)

2018-AT-05	Elaboração de Norma para a Classificação e Tratamento das informações		INÍCIO	FIM
			Fev/18	Dez/18
OBJETIVO	Estabelecer critérios de classificação da informação, requisitos de segurança e requisitos de auditoria das informações geradas e disponibilizadas pelo Tribunal Superior do Trabalho promovendo proteção e disciplinando o seu uso.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Impedimento de acesso indevido a informações sob sigilo de justiça. • Dimensionamento e proteção de recursos que utilizam informações classificadas. • Redução de vazamento de informações sensíveis ou que possam comprometer a imagem do órgão. 		CGOV	SGSI
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI		VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO
3	Garantir a infraestrutura de TIC	IE05	Promover o dimensionamento adequado dos recursos de TIC.	-
5	Aprimorar a gestão de riscos de TIC	IE14	Modernizar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação do TST.	

2018-AT-06	Expansão do monitoramento de aplicações		INÍCIO	FIM
			Fev/18	Dez/18
OBJETIVO	Expandir a ferramenta de monitoramento de <i>performance</i> de aplicação (APM) para o monitoramento fim a fim.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliação da visibilidade de problemas com as aplicações. • Redução do tempo de diagnóstico e solução de problemas associados à infraestrutura. • Melhoria na disponibilidade dos sistemas e da infraestrutura de TIC. 		CITEC	SGSC
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI		VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO
3	Garantir a infraestrutura de TIC	IE03	Garantir a disponibilidade de soluções essenciais às atividades judicantes e administrativas.	2018-AO-009 2018-AO-010

AÇÕES TÉCNICAS (CONTINUAÇÃO)

2018-AT-07	Estudo para contratação de <i>outsourcing</i> de impressão e digitalização no Tribunal		INÍCIO	FIM
			Abr/18	Dez/18
OBJETIVO	Avaliar eventual economia com aquisição, manutenção de impressoras e com suprimentos.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	• Eventual economia com aquisição, manutenção de impressoras e com suprimentos		CSUP	SAEQ
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI		VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO
3	Garantir a infraestrutura de TIC	IE03 IE05	Garantir a disponibilidade de soluções essenciais às atividades judicantes e administrativas. Promover o dimensionamento adequado dos recursos de TIC.	-

2018-AT-08	Estudo para contratação de solução unificada de colaboração		INÍCIO	FIM
			Jan/18	Dez/18
OBJETIVO	Avaliar alternativas para implementação de solução de colaboração.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	• Convergência dos ambientes de mensageria instantânea e comunicação corporativa, tornando disponíveis recursos de trabalho colaborativo.		CSUP	SSUPE
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI		VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO
3	Garantir a infraestrutura de TIC	IE03	Garantir a disponibilidade de soluções essenciais às atividades judicantes e administrativas.	-

AÇÕES TÉCNICAS (CONTINUAÇÃO)

2018-AT-09	Implantação de plataforma como serviço (PaaS)		INÍCIO	FIM
			Ago/17	Jun/18
OBJETIVO	Modernizar o mecanismo de provimento de infraestrutura.		RESPONSÁVEL	
			UNIDADE	SEÇÃO
BENEFÍCIOS ESPERADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Agilidade na entrega de soluções. • Aprimoramento da padronização de infraestrutura. • Aprimoramento da a disponibilidade dos serviços. • Possibilidade de entrega contínua. 		CITEC	SGSC
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		INICIATIVA ESTRATÉGICA DE TI		VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO
3	Garantir a infraestrutura de TIC	IE03	Garantir a disponibilidade de soluções essenciais às atividades judicantes e administrativas.	2018-AO-011
		IE04	Promover prospecção tecnológica de forma a propiciar a inovação contínua.	


8. ORÇAMENTO

O Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação previsto para 2018 encontra-se no Anexo I.


Os quadros a seguir (tabela e gráficos), de cunho gerencial, demonstram a alocação orçamentária de TIC para 2018, de acordo com perfis de investimento.

PERFIL DE INVESTIMENTO	DETALHAMENTO DO PERFIL DE INVESTIMENTO	Total
☐ Administração de dados e integração	Prestação de Serviços	R\$ 337.415,88
	Suporte especializado	R\$ 84.432,84
	Subtotal	R\$ 421.848,72
☐ Análise de dados e inteligência de negócio (B.I)	Licenciamento	R\$ 2.354.752,90
	Subtotal	R\$ 2.354.752,90
☐ Atendimento ao Usuário	Consumo	R\$ 107.950,00
	Equipamentos	R\$ 132.675,00
	Licenciamento	R\$ 105.000,00
	Prestação de Serviços	R\$ 5.928.310,60
	Suporte especializado	R\$ 305.275,67
Subtotal	R\$ 6.579.211,27	
☐ Desenvolvimento de Software	Licenciamento	R\$ 548.315,28
	Prestação de Serviços	R\$ 552.700,00
Subtotal	R\$ 1.101.015,28	
☐ Gestão e Governança de TI	Licenciamento	R\$ 1.800.000,00
	Prestação de Serviços	R\$ 330.628,20
Subtotal	R\$ 2.130.628,20	
☐ Infraestrutura	Consumo	R\$ 28.000,00
	Equipamentos	R\$ 5.853.487,55
	Licenciamento	R\$ 2.336.560,48
	Prestação de Serviços	R\$ 956.984,22
	Suporte especializado	R\$ 2.151.829,81
Subtotal	R\$ 11.326.862,06	
☐ Segurança da Informação	Suporte especializado	R\$ 108.599,04
Subtotal	R\$ 108.599,04	
Total Geral		R\$ 24.022.917,47

Total por perfil de investimento

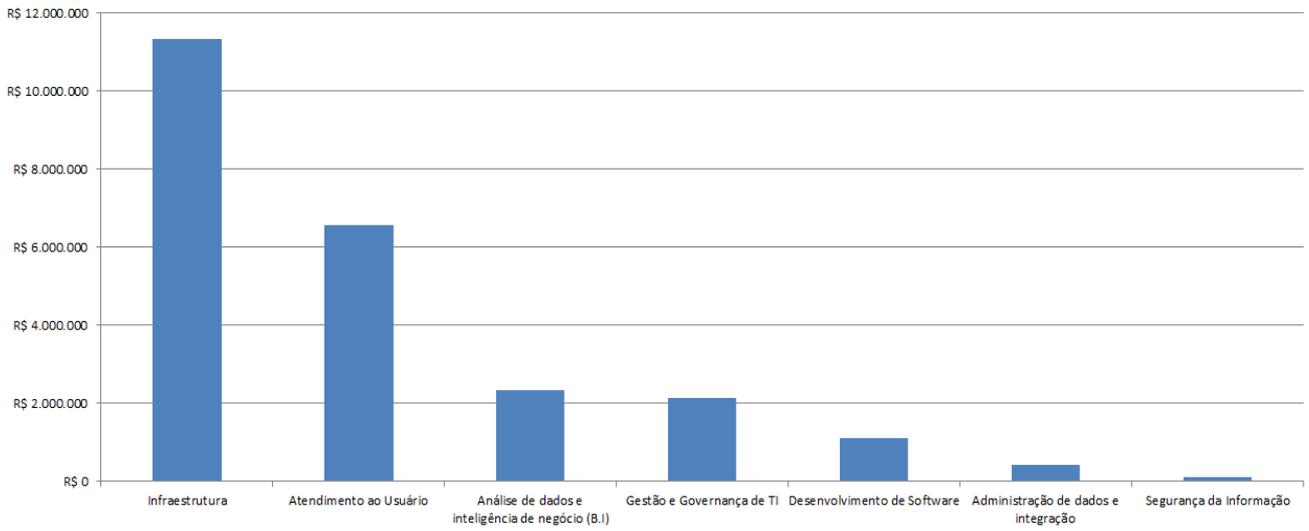

Total por detalhe de investimento

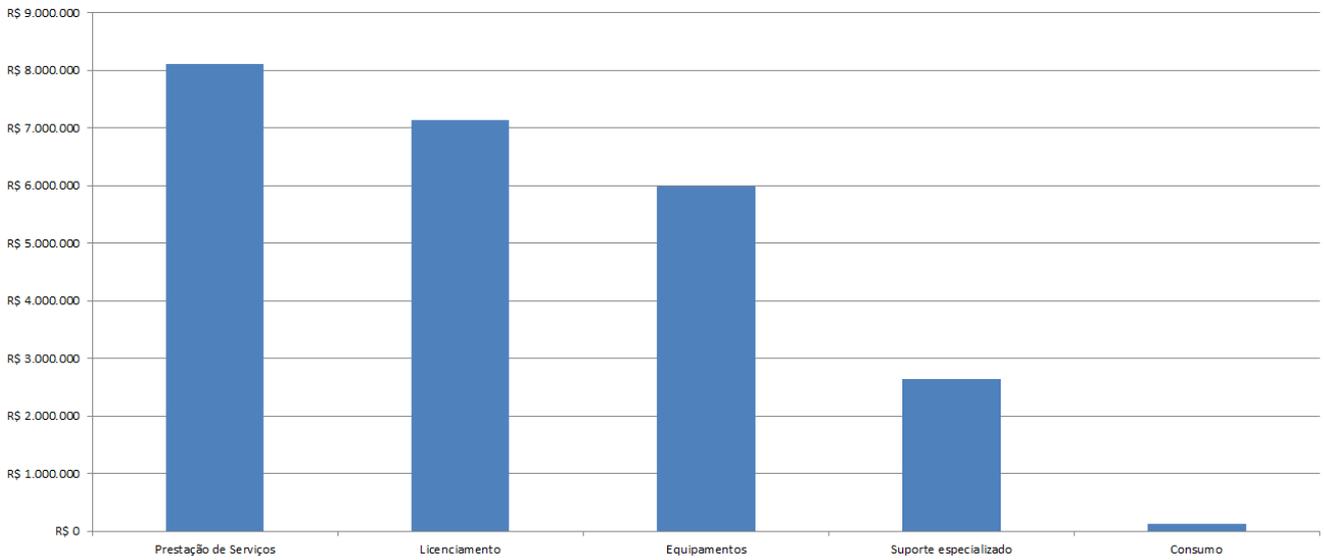

9. CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO DE TIC PARA 2018

A tabela abaixo relaciona as datas de realização das principais atividades de governança, planejamento e gestão de TIC do TST previstas para o ano de 2018.

Calendário Administrativo de TIC	
Reuniões de Avaliação da Estratégia de TIC – RAEs	23 de fevereiro de 2018
	13 de abril de 2018
	10 de agosto de 2018
	19 de outubro de 2018
Propostas PDTIC 2019 e Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação 2019	30 de novembro de 2018

10. CONCLUSÃO

Este documento tem a finalidade de apresentar a proposta do Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTIC) do TST para o ano de 2018. Nele, encontram-se registrados os principais projetos e ações da SETIN que consubstanciam sua contribuição para o alcance das metas institucionais ao longo do ano, observadas as diretrizes de TIC da atual administração do Tribunal.

Qualquer instrumento de planejamento que se pretenda efetivo deve ser necessariamente dinâmico. Portanto, o presente documento pressupõe revisões periódicas ao longo de seu período de execução, de forma a se manterem alinhadas as iniciativas de Tecnologia da Informação às necessidades institucionais.

Nesse sentido, entende o Comitê de Gestão de TIC da SETIN que o diálogo permanente com a Alta Administração desta Corte constitui-se pressuposto essencial à garantia de tal alinhamento, estando o PDTIC 2018 sujeito a reavaliações e evoluções periódicas, a critério da Alta Administração do TST.

Brasília, 29 de novembro de 2017.

EQUIPE EXECUTIVA

Humberto Magalhães Ayres

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

Leonardo Lobo Pulcineli

Coordenador de Infraestrutura Tecnológica

Tiago da Costa Peixoto

Coordenador de Apoio à Governança e Gestão de TIC

Wellington Samuel da Silva Monteiro

Assessor de Relacionamento de Tecnologia da Informação

Ramai Riether Azoubel
Assessor Técnico e Administrativo

Alexandre William Majdalani
Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas

Paulo Jorge Bacchini de Araujo Lima
Coordenador de Suporte Técnico aos Usuários

Data:

De acordo: _____
Ministro ALEXANDRE AGRA BELMONTE
Coordenador do Comitê de Governança de TIC do TST

Data:

Aprovação: _____
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

11. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES DO PDTIC 2018

1ª REVISÃO DO PDTIC 2018		DATA:
PROJETO/AÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO	
2ª REVISÃO DO PDTIC 2018		DATA:
PROJETO/AÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO	
3ª REVISÃO DO PDTIC 2018		DATA:
PROJETO/AÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO	
4ª REVISÃO DO PDTIC 2018		DATA:
PROJETO/AÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO	

ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2018

PLANO DE CONTRATAÇÕES SETIN - 2018
 versão 1.0 - a submeter ao CGTI

ITEM	AÇÃO NR.	PROCESSO	TIPO DE CONTRATO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE DEMANDANTE	VIGÊNCIA	JUSTIFICATIVA P/ AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA		ELEMENTO DE DESPESA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	NATUREZA DA DESPESA	PERFIL DE INVESTIMENTO	DETALHAMENTO DO PERFIL DE INVESTIMENTO	FONTE DO RECURSO	QTD	ESTIMATIVA PRELIMINAR UNITÁRIA	ESTIMATIVA PRELIMINAR PARA 2018	ESTIMATIVA PRELIMINAR TOTAL (5 ANOS)	VINCULAÇÃO COM O PDTC 2018	VINCULAÇÃO COM O PETIC 2015-2020	UNIDADE TÉCNICA	Unidade
								ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO														
1	2013-AO-022c	505449/2014 505476/2013 501983/2017	Continuado	Serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução BI Suite (1 licenças) e SAP Business Analytics Professional User (4 licenças) - PE-144/2013-B.	CDS	11/11/2018	Serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução BI Suite (1 licenças) e SAP Business Analytics Professional User (4 licenças) - PE-144/2013-B.	n/a	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.3.3.9.0.39.08	3 - Corrente	Análise de dados e inteligência de negócio (B.I)	Licenciamento	SETIN	10,40	R\$ 8.913,50	R\$ 92.700,40	R\$ 534.810,00	n/a	n/a	CDS/SIAD	CDS
2	2013-AO-024	504771/2012 500191/2017	Continuado	Contratação de serviço de suporte e atualização do Software de Modelagem de Dados, Power Designer Data Architect Enterprise (18 licenças) - First Decision - PE-066/2013.	CGOV	18/08/2018	Suporte técnico e atualização das dezoito licenças fixas e flutuantes que apoiam o processo de desenvolvimento de sistemas informatizados.	20/04/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.3.3.9.0.39.08	3 - Corrente	Administração de dados e integração	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 7.036,07	R\$ 84.432,84	R\$ 422.896,80	n/a	n/a	CGOV/SADD	CGOV
3	2013-AO-025	504162/2012 503639/2016	Continuado	Contratação de serviços de suporte e manutenção de equipamentos de comunicação de dados CISCO. Em substituição ao P. 127.315/2007 - CITEC.	CITEC	21/05/2018	Manutenção do contrato de suporte para equipamentos de rede CISCO.	21/01/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção Cons. Equip. de Procc. de Dados - 3.3.3.9.0.39.95	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 26.475,60	R\$ 317.707,20	R\$ 1.588.536,00	n/a	n/a	CITEC/SGRE	CITEC
4	2013-AO-029	500744/2013 501242/2017	Continuado	Contratação de serviço de Suporte Técnico aos Usuários (Service Desk) - CSUP.	CSUP	24/11/2017	Continuidade de serviço de suporte técnico aos usuários do TST - 1ª e 2ª níveis de atendimento.	27/07/2018	n/a	Locação de Mão-de-obra - 3.3.3.9.0.37.00	Suporte a Usuários de TI - 3.3.3.9.0.37.28	3 - Corrente	Atendimento ao Usuário	Prestação de Serviços	SETIN	12,00	R\$ 480.305,00	R\$ 5.763.660,00	R\$ 28.818.300,00	n/a	n/a	CSUP/SGSA	CSUP
5	2013-AO-032a	501828/2013 502844/2017	Continuado	Prestação de serviços de manutenções em storage de dados Clarion, Switch Comunicação Director, Servidores Dell PE R710 e Outros - PE-068/2013-A.	CITEC	11/12/2017	O processo visa garantir a funcionalidade dos equipamentos através da prestação de serviços de manutenções técnicas corretivas e preventivas nos mesmos.	13/08/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção Cons. Equip. de Procc. de Dados - 3.3.3.9.0.39.95	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 8.843,39	R\$ 106.120,68	R\$ 530.603,40	n/a	n/a	CITEC/SAIF	CITEC
6	2013-AO-032b	505106/2013 501986/2017	Continuado	Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo manutenções corretivas e preventivas, em storage de dados Clarion, Switch Comunicação Director, Servidores Dell PE R710 e Outros - PE-068/2013-B, Item 2.	CITEC	03/12/2018	O processo visa garantir a funcionalidade dos equipamentos através da prestação de serviços de manutenções técnicas corretivas e preventivas nos mesmos.	05/08/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção Cons. Equip. de Procc. de Dados - 3.3.3.9.0.39.95	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 1.328,00	R\$ 15.936,00	R\$ 79.680,00	n/a	n/a	CITEC/SAIF	CITEC
7	2013-AO-035	502070/2012 504632/2016	Continuado	Manutenção do Switch SAN utilizado no TCU.	CITEC	13/06/2018	Contratação de empresa para prestar serviço de suporte técnico on site durante período de garantia.	13/02/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção Cons. Equip. de Procc. de Dados - 3.3.3.9.0.39.95	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 833,33	R\$ 9.999,96	R\$ 49.999,80	n/a	n/a	CITEC/SAIF	CITEC
8	2014-AO-044	503293/2013	Continuado	Contratação de serviços de prognósticos e aconselhamento tático e estratégico em Tecnologia da Informação - Assinatura Tipo 1 - Consultoria (Coparticipação à ata de registro de preço do TCU). Contrato PRP-002/2014 - ASPP.	CGOV/SETIN	27/07/2018	Subsidiar os processos de tomada de decisão e de gestão de TI.	29/03/2018	n/a	Serviços de Consultoria - 3.3.3.9.0.35.00	Consultoria em Tecnologia da Informação - 3.3.3.9.0.35.04	3 - Corrente	Gestão e Governança de TI	Prestação de Serviços	SETIN	12,00	R\$ 21.013,05	R\$ 252.156,60	R\$ 1.270.852,80	n/a	n/a	CGOV	CGOV
9	2014-AO-086b	503425/2014	Continuado	Contratação de suporte de licenças do Xen App.	CITEC	29/12/2017	Regularizar o suporte da solução utilizado para o Gabinete Virtual, atendendo a demanda do Teletrabalho e gabinetes dos Desembargadores requisitados. Pretende-se ainda atualizar a plataforma, ofertando mais recursos aos usuários do Gabinete Virtual.	31/08/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.3.3.9.0.39.08	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 5.466,95	R\$ 65.603,40	R\$ 328.017,00	n/a	n/a	CITEC/SGRE	CITEC
10	2014-AO-087	502430/2014 501985/2017	Continuado	Contratação de serviço de suporte técnico, atualização de versão e upgrade da Solução para segurança de aplicações - Fortify.	CGOV	22/11/2018	Renovação do serviço de suporte técnico e atualização de versão e upgrade para manter a solução de segurança de aplicações - Fortify.	25/07/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.3.3.9.0.39.08	3 - Corrente	Segurança da Informação	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 393.273,60	n/a	n/a	CGOV/SSEGI	CGOV
11	2014-AO-088	503320/2014 503293/2013	Continuado	Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em TI e comunicações - Assinatura Tipo 2 - Atuação Gerencial. Contrato PRP-003/2014.	CAUGE	27/07/2018	DEMANDA EXTERNA: CAUGE.	n/a	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades - 3.3.3.9.0.39.01	3 - Corrente	Gestão e Governança de TI	Prestação de Serviços	SETIN	12,00	R\$ 6.539,30	R\$ 78.471,60	R\$ 395.491,80	n/a	n/a	CGOV	CGOV
12	2014-AO-098a	501741/2015	Continuado	Contratação de acesso ao SINAPI - Sistema de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Demanda da CMAP.	CMAP	13/12/2020	Demanda da CMAP.	n/a	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Comunicação de Dados - 3.3.3.9.0.39.97	3 - Corrente	Desenvolvimento de Software	Prestação de Serviços	SETIN	1,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	n/a	n/a	CDS	CDS
13	2015-AO-005	501089/2015 501221/2017	Continuado	Prestação de serviços de Monitoramento e Operação de Centro de Infraestrutura (Datacenter) - CITEC. Contratada HITTS do Brasil	CITEC	06/09/2018	Necessidade da inclusão de diversas atividades a serem executadas pelos terceirizados, executados no Centro de Infraestrutura Computacional e no TCU.	09/05/2018	n/a	Locação de Mão-de-obra - 3.3.3.9.0.37.00	Suporte a Usuários de TI - 3.3.3.9.0.37.28	3 - Corrente	Infraestrutura	Prestação de Serviços	SETIN	12,00	R\$ 63.082,02	R\$ 756.984,22	R\$ 3.784.921,10	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SAIF	CITEC
14	2015-AO-011	501094/2015 501250/2017	Continuado	Contratação de serviço de suporte técnico da rede sem fio (renovação).	CITEC	21/09/2018	Resolver de maneira definitiva os problemas recorrentes na rede sem fio e aprimorar a forma como os usuários lidam com esse mecanismo de comunicação. Com a renovação do suporte técnico, será possível a atualização da versão do firmware dos equipamentos do de rede sem fio.	24/05/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Serviços Técnicos Profissionais de TI - 3.3.3.9.0.39.57	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 9.909,81	R\$ 118.917,72	R\$ 594.588,60	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGRE	CITEC
15	2015-AO-017	504973/2015 500330/2015	Continuado	Contratação de suporte para licenças dos servidores de aplicação RH JBoss Enterprise Application Platform e ferramenta de monitoramento Red Hat JBoss Operations Network for EAP.	CITEC	12/01/2018	O suporte anterior era financiado pelo CSJT que decidiu não renová-lo. É necessário suporte para licenças do TST. O suporte inclui atualização de versão para o Jboss e para o Jhon. O TST irá aderir a ATA de registro de preços do CSJT.	14/09/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.3.3.9.0.39.08	3 - Corrente	Infraestrutura	Licenciamento	SETIN	12,00	R\$ 8.429,48	R\$ 101.153,76	R\$ 505.768,80	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGSC	CITEC
16	2015-AO-023	502588/2015 502530/2016	Continuado	Contratação do suporte e atualização da solução BMC Footprints - Contrato PE-001/2016.	CSUP	10/02/2018	Necessidade de manutenção e suporte da solução de Service Desk.	13/10/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.3.3.9.0.39.08	3 - Corrente	Atendimento ao Usuário	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 4.617,42	R\$ 55.409,04	R\$ 277.045,20	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CSUP/SGSA	CSUP
17	2015-AO-025	505024/2014 503236/2016	Continuado	Contratação de suporte para os equipamentos de armazenamento (storage) VNX - Compwire Informática - Contrato PE-014/2015 - CITEC.	CITEC	06/04/2018	Contratação de suporte para os equipamentos de armazenamento onde são armazenados todos os dados dos sistemas informatizados do TST.	07/12/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção Cons. Equip. de Procc. de Dados - 3.3.3.9.0.39.95	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 27.465,75	R\$ 329.589,00	R\$ 1.647.945,00	n/a	n/a	CITEC/SAIF	CITEC
18	2015-AO-029	500124/2015 501248/2017	Continuado	Contratação de serviço de suporte técnico diretamente com a fabricante dos produtos Microsoft Premier - CITEC.	CITEC	20/09/2018	Contratação de suporte técnico em produtos Microsoft (equivalente a 580 horas).	23/05/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.3.3.9.0.39.08	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 25.287,00	R\$ 303.444,00	R\$ 1.517.220,00	n/a	n/a	CITEC/SGSB	CITEC
19	2015-AO-034	501082/2015 501247/2017	Continuado	Contratação de serviços de suporte e atualização de versão do software de portal Literay - SEA TECNOLOGIA - CDS. Contrato PE-066/2015.	CSUP	07/09/2018	Manutenção do suporte já contratado da ferramenta de Portal Internet e intranet do TST e CSJT.	10/05/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.3.3.9.0.39.08	3 - Corrente	Atendimento ao Usuário	Suporte especializado	SETIN	1,00	R\$ 173.148,71	R\$ 173.148,71	R\$ 865.743,55	n/a	n/a	CSUP/SSC	CSUP
20	2015-AO-035b1	504817/2013	Continuado	Contratação de serviço de atualização e upgrade de versão de solução de tecnologia da informação para gestão de pessoas por competências - Intelit. Contrato PE-023/2015.	SEGPEP	04/05/2018	Demanda externa: SEGPEP.	04/01/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.3.3.9.0.39.08	3 - Corrente	Desenvolvimento de Software	Licenciamento	SETIN	12,00	R\$ 8.750,00	R\$ 105.000,00	R\$ 525.000,00	n/a	n/a	CDS	CDS

PLANO DE CONTRATAÇÕES SETIN - 2018
versão 1.0 - a submeter ao CGTI

ITEM	AÇÃO NR.	PROCESSO	TIPO DE CONTRATO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE DEMANDANTE	VIGÊNCIA	JUSTIFICATIVA P/ AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA		ELEMENTO DE DESPESA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	NATUREZA DA DESPESA	PERFIL DE INVESTIMENTO	DETALHAMENTO DO PERFIL DE INVESTIMENTO	FONTE DO RECURSO	QTD	ESTIMATIVA PRELIMINAR UNITÁRIA	ESTIMATIVA PRELIMINAR PARA 2018	ESTIMATIVA PRELIMINAR TOTAL (5 ANOS)	VINCULAÇÃO COM O PDTC 2018	VINCULAÇÃO COM O PETIC 2015-2020	UNIDADE TÉCNICA	Unidade
								ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO														
21	2016-AO-001b	501855/2014 501982/2017	Continuado	Manutenção e suporte dos equipamentos Biocoletores.	CSUP	27/11/2017	Manutenção e suporte dos biocoletores para registro da frequência dos servidores.	30/07/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção Cons. Equip. de Procc. de Dados - 3.33.90.39.95	3 - Corrente	Atendimento ao Usuário	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 4.299,94	R\$ 51.599,28	R\$ 257.996,40	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CSUP/SAEQ	CSUP
22	2016-AO-007	501344/2016 501255/2017	Continuado	Contratação de serviço de disponibilização das bases de dados do CNPJ e do CPF de propriedade da Receita Federal - SERPRO - CGI.	SEGP	29/09/2018	Manutenção da base de dados da Receita Federal para uso na CNDT e demais sistemas corporativos.	01/06/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Comunicação de Dados - 3.33.90.39.97	3 - Corrente	Administração de dados e integração	Prestação de Serviços	SETIN	12,00	R\$ 28.117,99	R\$ 337.415,88	R\$ 1.632.558,60	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CGOV/SADD	CGOV
23	2016-AO-014	502418/2016	Continuado	Contratação de serviços de suporte e manutenção de equipamentos de comunicação de dados CISCO.	CITEC		Contratação de suporte, manutenção e atualização de equipamentos de comunicação de dados.	21/06/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção Cons. Equip. de Procc. de Dados - 3.33.90.39.95	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 3.475,00	R\$ 41.700,00	R\$ 208.500,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGRE	CITEC
24	2016-AO-015	502627/2015	Continuado	Contratação de serviço de manutenção e suporte de software da plataforma EMC ECM/DOCUMENTUM (GED) - CITEC.	CITEC	17/01/2018	Contratação de suporte e atualização dos produtos da plataforma Documentum	19/09/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	1,00	R\$ 46.672,00	R\$ 46.672,00	R\$ 233.360,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGSC	CITEC
25	2016-AO-016	504750/2015 504640/2015	Continuado	Contratação de serviços de suporte técnico de softwares de virtualização Vmware - Contrato PE-010/2016.	CITEC	27/02/2018	Contratação de suporte dos Softwares de virtualização, contemplando todo ambiente de virtualização no TST e no site de contingência no TCU.	30/10/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	1,00	R\$ 195.999,93	R\$ 195.999,93	R\$ 195.999,93	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGSB	CITEC
26	2016-AO-017	504963/2015 504636/2016	Continuado	Contratação de serviços de assistência técnica (manutenção corretiva e preventiva, atualização e suporte técnico) para servidores em lâmina (blades) - Contrato PE-034/2016.	CITEC	18/07/2018	Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção corretiva e preventiva, atualização e suporte técnico para servidores em lâmina (blades) - Contrato PE-034/2016.	20/03/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção Cons. Equip. de Procc. de Dados - 3.33.90.39.95	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 9.890,09	R\$ 118.681,08	R\$ 593.405,40	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SAIF	CITEC
27	2016-AO-018a	500282/2016 504515/2016 501256/2017	Continuado	Contratação de manutenção para os robôs de backup - mod. IBM 3494 L12 com 6 drives - Contrato PE-051/2016.	CITEC	09/10/2018	Renovação, por meio de nova contratação, do suporte para os drives dos robôs de backup	11/06/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 3.666,66	R\$ 43.999,92	R\$ 219.999,60	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SAIF	CITEC
28	2016-AO-018b	504515/2016 500282/2016	Continuado	Contratação de manutenção para os robôs de backup - mod. Quantum Scalar 1500 com 4 drives - Contrato PE-085/2016.	CITEC	26/12/2017	Renovação, por meio de nova contratação, do suporte para os drives dos robôs de backup	28/08/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 3.666,66	R\$ 43.999,92	R\$ 219.999,60	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SAIF	CITEC
29	2016-AO-030b1	500148/2016 503638/2016	Continuado	Renovação do suporte de solução de AntiSpam - atualização de licenças de software - Contrato PRP-002/2016.	CITEC	05/05/2018	Aquisição de suporte para renovação das licenças da solução de antispam utilizada pelo TST	05/01/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.4.4.9.0.39.00	Aquisição de Software - 3.44.90.39.93	4 - Capital	Infraestrutura	Licenciamento	SETIN	12,00	R\$ 5.415,00	R\$ 64.980,00	R\$ 324.900,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGSB	CITEC
30	2016-AO-033	501199/2016 504635/2016	Continuado	Contratação de serviços de suporte técnico do software de gravação das Sessões de Julgamento (FTR) - CSUP.	CAMIN	10/07/2018	Suporte de licenças do software que realiza a gravação das sessões de julgamento do TST - FTR.	12/03/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Atendimento ao Usuário	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 1.061,51	R\$ 12.738,12	R\$ 63.690,60	n/a	n/a	CSUP/SSUPE	CSUP
31	2017-AO-001	502335/2015 502847/2017	Continuado	Contratação de suporte e atualização de licenças para o software RiskManager.	CGOV	13/12/2017	Renovação do serviço de suporte e atualização de licenças para o software RiskManager.	15/08/2018	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Segurança da Informação	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 3.049,92	R\$ 36.599,04	R\$ 189.834,00	n/a	4. APRIMORAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TIC	SGSI	CGOV
32	2017-AO-010	502199/2017	Continuado	Renovação de serviço de suporte de licença de software Jira.	CDS		Auxiliar na gerencia de diversos processos da SETIN (gestão de mudança, portfólio de projetos, desenvolvimento de software, dentre outros).	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.4.4.9.0.39.00	Aquisição de Software - 3.44.90.39.94	4 - Capital	Desenvolvimento de Software	Licenciamento	SETIN	1,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	n/a	7. ASSEGURAR O FOCO NO JURISDICIONADO E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC	CDS/SGED	CDS
33	2017-AO-012	501443/2017	Continuado	Contratação de serviço de manutenção Internet de alta velocidade - CLICKNET BRASILIA - CSUP.	CSUP	01/11/2018	Continuidade de acesso a internet de alta velocidade nas residências dos Exm's Ministros.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Comunicação de Dados - 3.33.90.39.97	3 - Corrente	Atendimento ao Usuário	Prestação de Serviços	SETIN	12,00	R\$ 6.637,55	R\$ 79.650,60	R\$ 398.253,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CSUP/STELCOM	CSUP
34	2017-AO-025	504549/2016	Continuado	Contratação de serviços de atualização e suporte de Software de virtualização Oracle para o TST, Oracle VM - ORACLE DO BRASIL - CITEC.	CITEC	15/06/2018	Suporte para software de virtualização de de banco de dados Oracle objetivando redução no custo total com licenças.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Infraestrutura	Licenciamento	SETIN	1,00	R\$ 5.286,00	R\$ 5.286,00	R\$ 253.728,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGBD	CITEC
35	2017-AO-027a	503830/2017	Continuado	Contratação de serviço de suporte para licenças do software Citrix Xen App	CITEC		Serviço de suporte da solução utilizada para o Gabinete Virtual, atendendo a demanda do Teletrabalho e gabinetes dos Desembargadores requisitados. Pretende-se ainda atualizar a plataforma, ofertando mais recursos aos usuários do Gabinete Virtual.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 216.000,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGRE	CITEC
36	2017-AO-029	500820/2017	Continuado	Contratação de serviço de suporte e atualização para sistemas operacionais Linux.	CITEC	13/08/2018	Contempla renovação de suporte e atualização (subscrição) dos sistemas operacionais Linux. Esse sistema operacional é executado em 84% das máquinas servidores do TST, sendo que nesse quantitativo estão contemplados todos os sistemas críticos ao Tribunal.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Infraestrutura	Licenciamento	SETIN	12,00	R\$ 8.548,06	R\$ 102.576,72	R\$ 512.883,60	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGSB	CITEC
37	2017-AO-032.1	503193/2017	Continuado	Modernização da plataforma de Backup - hardware.	CITEC		Modernização do robo de Backup para atender a demanda crescente por armazenamento e garantir o rápido retorno em caso de falha. Substituição do armazenamento em fita atual por para tecnologias mais modernas de armazenamento.	30/04/2018	30/04/2018	Equipamentos e Material Permanente - 3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos de Processamento de Dados - 3.44.90.52.35	4 - Capital	Infraestrutura	Equipamentos	SETIN	1,00	R\$ 1.656.097,00	R\$ 1.656.097,00	R\$ 1.656.097,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SAIF	CITEC
38	2017-AO-033	500102/2017	Continuado	Contratação de suporte para Firewall de rede	CITEC	07/05/2018	Necessidade de contratação de suporte para os equipamentos de segurança de rede denominados Firewall. Sem esses equipamentos não é possível o acesso a internet e nem aos sistemas do TST disponibilizados ao público externo.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção Cons. Equip. de Procc. de Dados - 3.33.90.39.95	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 17.750,00	R\$ 213.000,00	R\$ 1.065.000,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGRE	CITEC
39	2017-AO-035	502096/2017	Continuado	Contratação de serviço de suporte técnico para solução de Video Wall	CITEC		Equipamento que permitirá disponibilizar o acesso externo à central telefônica do TST. Visa aprimorar a experiência do usuário com comunicação de voz e reduzir custos com telefonia fixa e móvel.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção Cons. Equip. de Procc. de Dados - 3.33.90.39.95	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 6.103,75	R\$ 73.245,00	R\$ 366.225,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGRE	CITEC

PLANO DE CONTRATAÇÕES SETIN - 2018
versão 1.0 - a submeter ao CGTI

ITEM	AÇÃO NR.	PROCESSO	TIPO DE CONTRATO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE DEMANDANTE	VIGÊNCIA	JUSTIFICATIVA P/ AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA		ELEMENTO DE DESPESA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	NATUREZA DA DESPESA	PERFIL DE INVESTIMENTO	DETALHAMENTO DO PERFIL DE INVESTIMENTO	FONTE DO RECURSO	QTD	ESTIMATIVA PRELIMINAR UNITÁRIA	ESTIMATIVA PRELIMINAR PARA 2018	ESTIMATIVA PRELIMINAR TOTAL (5 ANOS)	VINCULAÇÃO COM O PDTC 2018	VINCULAÇÃO COM O PETIC 2015-2020	UNIDADE TÉCNICA	Unidade
								ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO														
40	2017-AO-036	503087/2017	Continuado	Renovação de serviços de atualização e suporte do software Oracle Database Enterprise TST - ORACLE DO BRASIL - CITEC.	CITEC		Renovação de suporte para software de banco de dados utilizado no TST. O contrato atual possui vigência final em 29/12/2017, dessa maneira faz necessária nova contratação.	31/08/2018	31/08/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Infraestrutura	Licenciamento	SETIN	12,00	R\$ 88.547,00	R\$ 1.062.564,00	R\$ 5.312.820,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGBD	CITEC
41	2017-AO-038	502454/2017	Continuado	Contratação de serviços de suporte técnico de licenças dos softwares ACL - Audit Command Language.	CITEC	03/10/2018	Nova contratação do suporte do Software de auditoria ACL	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Infraestrutura	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 2.934,50	R\$ 35.214,00	R\$ 176.070,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGSC	CITEC
42	2017-AO-046b	503370/2017	Continuado	Serviços de suporte técnico e atualização de versão do Session Board Controller - SBC	CSUP		Visa a permitir a manutenção do software de firewall de voz, para acesso externo à central telefônica do TST, com objetivo de aprimorar a experiência do usuário com comunicação de voz e reduzir custos com telefonia fixa e móvel.	30/05/2018	30/05/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Atendimento ao Usuário	Suporte especializado	SETIN	12,00	R\$ 1.031,71	R\$ 12.380,52	R\$ 61.902,60	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CSUP/TELECOM	CSUP
43	2017-AO-049	503090/2017	Continuado	Contratação de serviços de manutenção do Software Automation System of Inventory, módulo de Almoxxarifado - CDS.	SEA/CMLOG		Sistema de almoxxarifado através do qual são feitas as solicitações da material por todas as unidades do Tribunal e controle pela CMLOG.	30/08/2018	30/08/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Desenvolvimento de Software	Licenciamento	SETIN	12,00	R\$ 10.942,94	R\$ 131.315,28	R\$ 656.576,40	n/a	n/a	CDS/SGED	CDS
44	2017-AO-050	503089/2017	Continuado	Serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução BI Suite (3 licenças), BO Data Integrator - ETL (1 licença) e SAP Business Analytics Professional User (15 licenças)	CDS		Serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução BI Suite (3 licenças), BO Data Integrator - ETL (1 licença) e SAP Business Analytics Professional User (15 licenças) - PE-144/13-A.	30/08/2018	30/08/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Análise de dados e inteligência de negócio (B.I)	Licenciamento	SETIN	12,00	R\$ 61.502,44	R\$ 738.029,28	R\$ 3.690.146,40	n/a	n/a	CDS/SIAD	CDS
45.1	2018-AO-001a		Continuado	Suprimento de Fundos - Serviços - PJ - CSUP.	CSUP	n/a	Cobrir despesas de pequeno vulto com serviços.	n/a	n/a	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	OST PJ - Pagto Antecipado - 3.33.90.39.96	3 - Corrente	Atendimento ao Usuário	Prestação de Serviços	SETIN	1,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CSUP/TELECOM	CSUP
45.2	2018-AO-001b		Continuado	Suprimento de Fundos - Material de consumo - CSUP.	CSUP	n/a	Cobrir despesas de pequeno vulto com material de consumo.	n/a	n/a	Material de Consumo - 3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo - Pagto Antecipado - 3.33.90.30.96	3 - Corrente	Atendimento ao Usuário	Consumo	SETIN	1,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CSUP/TELECOM	CSUP
46	2018-AO-002		Novo	Contratação e implantação da ferramenta de gestão de serviços de TI - ITSM	CGOV		Contratação e implantação da nova ferramenta de gestão de serviços de TI - ITSM	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.4.4.9.0.39.00	Aquisição de Software - 3.44.90.39.93	4 - Capital	Gestão e Governança de TI	Licenciamento	SETIN	1,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	2018-PR-01	4. APRIMORAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TIC	CGOV/SGPRO	CGOV
47	2018-AO-003		Novo	Contratação de serviços para inclusão de novas funcionalidades e reprogramação da URA, por solicitação da Ouvidoria	CSUP		Necessidade de aprimorar o atendimento ao público externo do TST pela Ouvidoria	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Atendimento ao Usuário	Prestação de Serviços	SETIN	1,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CSUP/TELECOM	CSUP
48	2018-AO-004		Novo	Aquisição de impressoras jato de tinta	CSUP		Para atendimento à demanda das unidades do Tribunal	30/04/2018	30/04/2018	Equipamentos e Material Permanente - 3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos de Processamento de Dados - 3.44.90.52.35	4 - Capital	Atendimento ao Usuário	Equipamentos	SETIN	12,00	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CSUP/SAEQ	CSUP
49	2018-AO-005		Novo	Aquisição de mídias criptográficas	CSUP		Para atendimento à demanda por certificados digitais de servidores	30/04/2018	30/04/2018	Material de Consumo - 3.3.3.9.0.30.00	Material de Processamento de Dados - 3.33.90.30.17	3 - Corrente	Atendimento ao Usuário	Consumo	SETIN	3.000,00	R\$ 32,65	R\$ 97.950,00	R\$ 97.950,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CSUP/SAEQ	CSUP
50	2018-AO-006		Novo	Aquisição de notebooks - ARP do TRT da 2ª Região	CSUP		Aquisição de notebooks para os ministros	30/04/2018	30/04/2018	Equipamentos e Material Permanente - 3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos de Processamento de Dados - 3.44.90.52.35	4 - Capital	Atendimento ao Usuário	Equipamentos	SETIN	27,00	R\$ 4.625,00	R\$ 124.875,00	R\$ 124.875,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CSUP/SAEQ	CSUP
51	2018-AO-007		Novo	Atualização de licenças do software que realiza a gravação das sessões de julgamento do TST - FTR.	CSUP		Necessidade de atualização do FTR para permitir a gravação e recuperação das sessões em Full HD.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.4.4.9.0.39.00	Aquisição de Software - 3.44.90.39.93	4 - Capital	Atendimento ao Usuário	Licenciamento	SETIN	15,00	R\$ 7.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CSUP/SSC	CSUP
52	2018-AO-008		Novo	Expansão da capacidade computacional do TST com aquisição de novos servidores Blades	CITEC		Ampliação da capacidade computacional do Datacenter do TST, visando melhorar a entrega de soluções e o desempenho geral das aplicações	30/04/2018	30/04/2018	Equipamentos e Material Permanente - 3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos de Processamento de Dados - 3.44.90.52.35	4 - Capital	Infraestrutura	Equipamentos	SETIN	1,00	R\$ 1.197.390,55	R\$ 1.197.390,55	R\$ 1.197.390,55	2018-AT-01	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SAIF	CITEC
53	2018-AO-009		Novo	Contratação de serviços para suporte especializado na solução de gerenciamento de performance de aplicação (APM)	CITEC		Visa atender as customizações no uso do APM para diversas aplicações bem como obter apoio especializado na resolução de problemas relacionadas ao desempenho das aplicações.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Infraestrutura	Prestação de Serviços	SETIN	1,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 1.000.000,00	2018-AT-06	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGSC	CITEC
54	2018-AO-010		Novo	Aquisição de licenças para software APM	CITEC		Expansão do uso das licenças de APM utilizadas no TST para auxiliar na melhoria contínua das aplicações	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.4.4.9.0.39.00	Aquisição de Software - 3.44.90.39.93	4 - Capital	Infraestrutura	Licenciamento	SETIN	1,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 1.500.000,00	2018-AT-06	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGSC	CITEC
55	2018-AO-011		Novo	Aquisição de subscrição para software de plataforma como serviço (PaaS)	CITEC		Para suportar as novas arquiteturas de desenvolvimento focadas em micro serviços e entrega contínua, faz-se necessário a aquisição de plataforma que seja capaz de entregar as exigentes demandas por novos sistemas. Essas plataformas são conhecidas como PaaS.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.4.4.9.0.39.00	Aquisição de Software - 3.44.90.39.93	4 - Capital	Infraestrutura	Licenciamento	SETIN	1,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.550.000,00	2018-IN-02	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGSC	CITEC

PLANO DE CONTRATAÇÕES SETIN - 2018
versão 1.0 - a submeter ao CGTI

ITEM	AÇÃO NR.	PROCESSO	TIPO DE CONTRATO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE DEMANDANTE	VIGÊNCIA	JUSTIFICATIVA P/ AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA		ELEMENTO DE DESPESA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	NATUREZA DA DESPESA	PERFIL DE INVESTIMENTO	DETALHAMENTO DO PERFIL DE INVESTIMENTO	FONTE DO RECURSO	QTD	ESTIMATIVA PRELIMINAR UNITÁRIA	ESTIMATIVA PRELIMINAR PARA 2018	ESTIMATIVA PRELIMINAR TOTAL (5 ANOS)	VINCULAÇÃO COM O PDTIC 2018	VINCULAÇÃO COM O PETIC 2015-2020	UNIDADE TÉCNICA	Unidade			
								ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO																	
56	2018-AO-012		Novo	Modernização da rede de dados do TST	CITEC		Necessidade de modernização da rede de dados do TST, que se encontra tecnologicamente defasada e com equipamentos encerrando o ciclo de vida do fabricante	30/04/2018	30/04/2018	Equipamentos e Material Permanente - 3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos de Processamento de Dados - 3.44.90.52.35	4 - Capital	Infraestrutura	Equipamentos	SETIN	1,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	2018-AT-02	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGRE	CITEC			
57	2018-AO-013		Novo	Aquisição de Certificados Digitais para sistemas	CITEC		Aquisição de certificados digitais ICP-Brasil, por meio de dispensa de licitação, em substituição aos da CEF que não são mais emitidos. Esse precisam ser comprados por dispensa por já se encontrarem vencidos.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.4.4.9.0.39.00	Aquisição de Software - 3.44.90.39.93	4 - Capital	Infraestrutura	Consumo	SETIN	1,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 46.666,67	n/a	2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC	CITEC/SGRE	CITEC			
58	2018-AO-014		Novo	Contratação de fábrica de software para prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação ágil de sistemas (Ponto Especificação por Exemplos).	CDS		Ampliação da capacidade de desenvolvimento de software.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.4.4.9.0.39.00	Desenvolvimento de Software - 3.44.90.39.92	4 - Capital	Desenvolvimento de Software	Prestação de Serviços	SETIN	1.000,00	R\$ 467,90	R\$ 467.900,00	R\$ 467.900,00	n/a	7. ASSEGURAR O FOCO NO JURISDICIONADO E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC	CDS/SGED	CDS			
59	2018-AO-015		Novo	Contratação de serviço de treinamento e capacitação para solução de segurança	CDS		Demanda externa: CSET.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Serviços Técnicos Profissionais de TI - 3.33.90.39.57	3 - Corrente	Desenvolvimento de Software	Prestação de Serviços	SETIN	1,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	n/a	7. ASSEGURAR O FOCO NO JURISDICIONADO E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC	CDS/SGED	CDS			
60	2018-AO-016		Novo	Contratação de serviço de instalação, configuração, parametrização, implementação e implantação de solução de segurança.	CDS		Demanda externa: CSET.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Serviços Técnicos Profissionais de TI - 3.33.90.39.57	3 - Corrente	Desenvolvimento de Software	Licenciamento	SETIN	1,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	n/a	7. ASSEGURAR O FOCO NO JURISDICIONADO E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC	CDS/SGED	CDS			
61	2018-AO-017		Novo	Contratação de serviço de suporte técnico e atualização de versão para solução de segurança	CDS		Demanda externa: CSET.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Serviços Técnicos Profissionais de TI - 3.33.90.39.57	3 - Corrente	Desenvolvimento de Software	Prestação de Serviços	SETIN	6,00	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 600.000,00	n/a	7. ASSEGURAR O FOCO NO JURISDICIONADO E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC	CDS/SGED	CDS			
62	2018-AO-018		Novo	Aquisição de licença de software de segurança.	CDS		Demanda externa: CSET.	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.4.4.9.0.39.00	Aquisição de Software - 3.44.90.39.94	4 - Capital	Desenvolvimento de Software	Licenciamento	SETIN	1,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	n/a	7. ASSEGURAR O FOCO NO JURISDICIONADO E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC	CDS/SGED	CDS			
63	2018-AO-019		Novo	Serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução BI Suite (1 licenças) e SAP Business Analytics Professional User (4 licenças)	CDS		Serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução BI Suite (1 licenças) e SAP Business Analytics Professional User (4 licenças)	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.3.3.9.0.39.00	Manutenção de Software - 3.33.90.39.08	3 - Corrente	Análise de dados e inteligência de negócio (B.I)	Licenciamento	SETIN	1,60	R\$ 15.014,51	R\$ 24.023,22	R\$ 900.870,60	n/a	7. ASSEGURAR O FOCO NO JURISDICIONADO E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC	CDS/SIAD	CDS			
64	2018-AO-020		Novo	Aquisição de ferramenta de BI	CDS		Atualização da ferramenta de B.I	30/04/2018	30/04/2018	Outros Serviços de Terceiros - PJ - 3.4.4.9.0.39.00	Aquisição de Software - 3.44.90.39.94	4 - Capital	Análise de dados e inteligência de negócio (B.I)	Licenciamento	SETIN	1,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	n/a	7. ASSEGURAR O FOCO NO JURISDICIONADO E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC	CDS/SIAD	CDS			
Valores totais																		R\$	24.022.917,47							
